



新北市政府 養護工程處

Maintenance Office, New Taipei City Government

三重區龍濱路(龍門路-長樂街) 兩側人行道改善工程

施工動態說明

中 華 民 國 1 1 4 年 1 2 月

工程基本資料

本案屬內政部國土管理署-永續提升人行安全計畫

工程名稱：三重區龍濱路（龍門路-長樂街）兩側人行道改善工程

主辦機關：新北市政府養護工程處

工期說明：開工：114年11月3日

設計監造：和建工程顧問股份有限公司

完工：115年8月19日

承攬廠商：福呈營造股份有限公司

工期：290日曆天

契約金額：61,660,000元




執行情形

進度說明：預定進度：5.17%

實際進度：5.67%

超前：+0.5%

	施工中
	未施工
	已完成

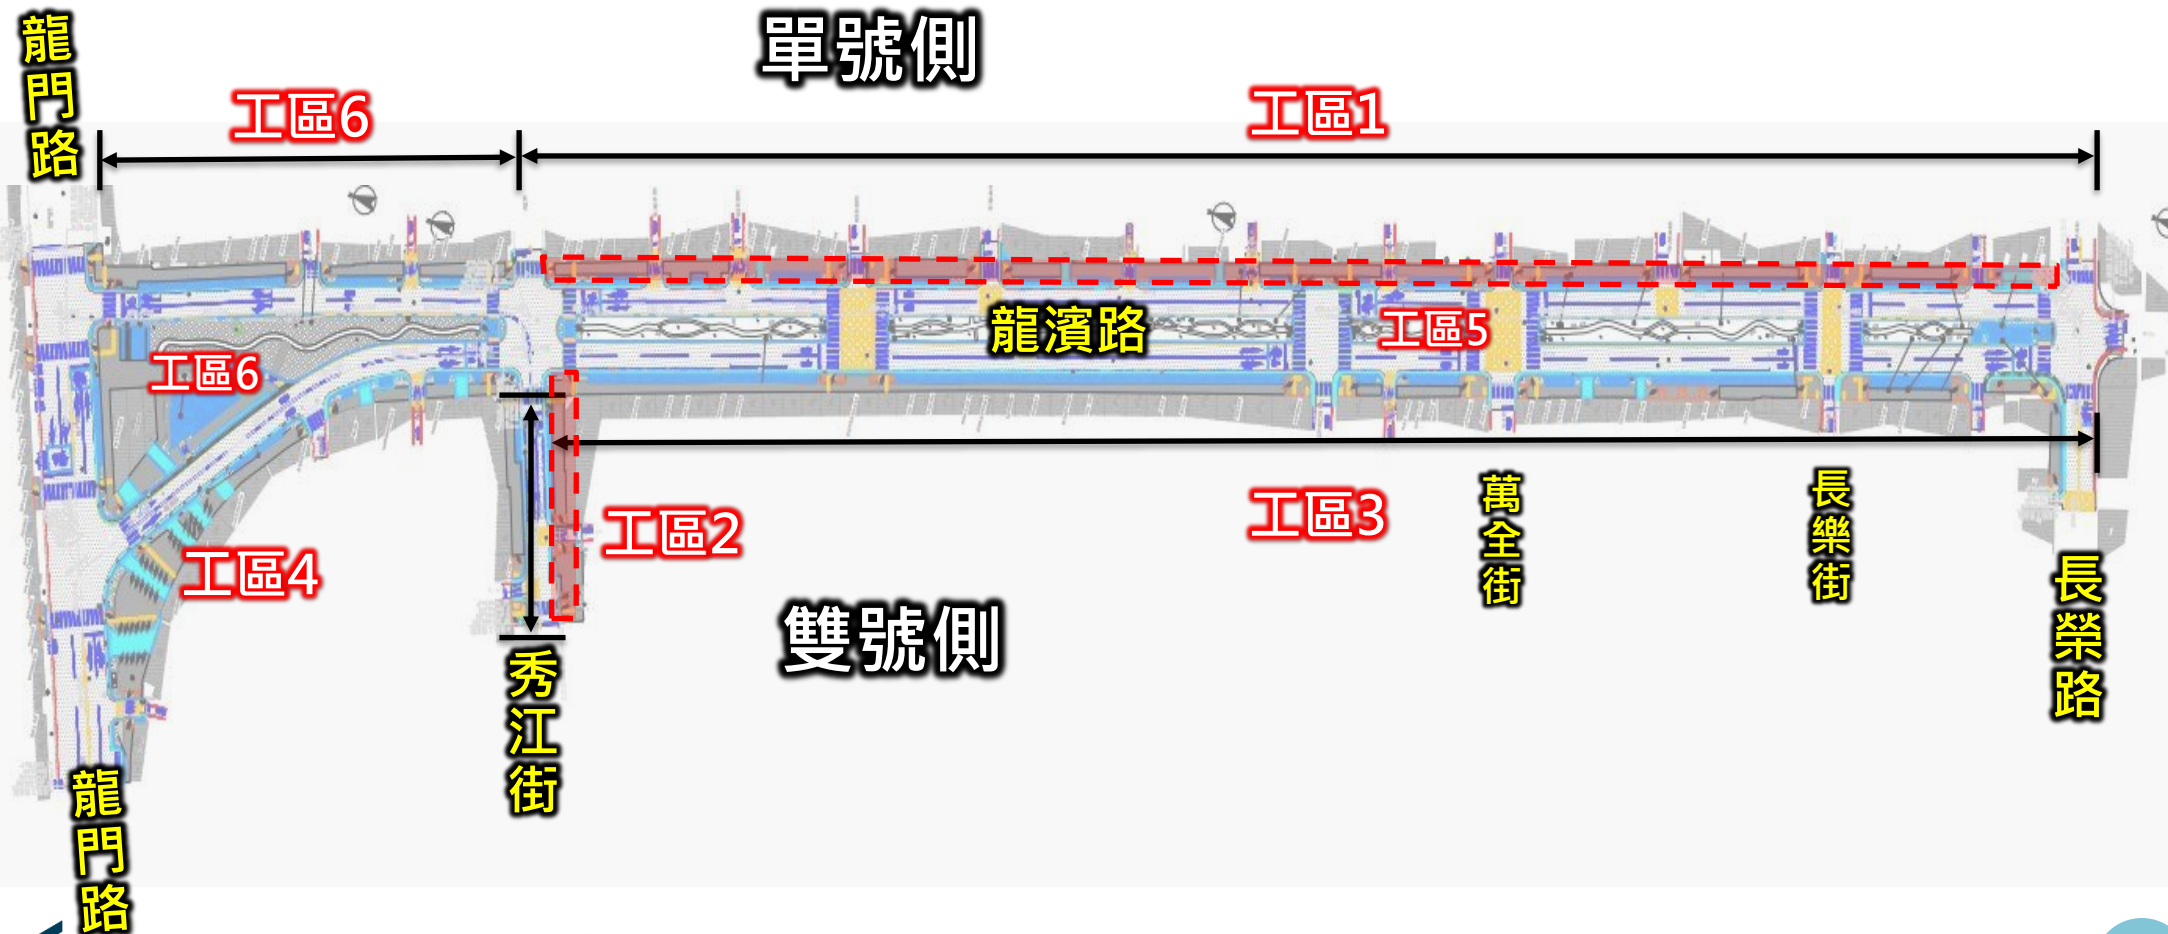

分段施工進度管控表

施工區塊	施作工項	目前進度	施工區塊	施作工項	目前進度	施工區塊	施作工項	目前進度
-1工區- 龍濱路 (秀江街~長榮路) 單號側	1.人行道打除	11/20~12/20	-2工區- 秀江街	1.人行道打除	1/20~2/10	-3工區- 龍濱路 (秀江街~長榮路) 雙號側	1.人行道打除	2/20~3/20
	2.弱電管溝	12/1~12/20		2.弱電管溝	2/1~2/10		2.弱電管溝	3/1~3/20
	3.排水施設	12/10~1/10		3.排水施設	2/1~2/20		3.排水施設	3/10~4/10
	4.人行道鋪磚	1/10~1/30		4.人行道鋪磚	2/10~2/28		4.人行道鋪磚	4/10~4/30
-4工區- 龍濱路 (龍門路~秀江街) 雙號側	1.人行道打除	4/20~5/20	-5工區- 分隔島 (秀江街~長榮路)	分隔島改善	6/10~6/30	-6工區- 龍濱路 (龍門路~秀江街) 雙號側 分隔島 (龍門路~秀江街)	1.人行道打除	7/1~7/15
	2.弱電管溝	5/1~5/20					2.弱電管溝	7/5~7/15
	3.排水施設	5/10~5/30					3.排水施設	7/10~7/20
	4.人行道鋪磚	5/20~6/10					4.人行道鋪磚	7/20~7/31

本週預計施作項目

- 1.樹木移植
- 2.工區1人行道澆置
- 3.工區2開挖

下週預計施作項目

- 1.工區1人行道澆置
- 2.工區2人行道、洩水板施作

本月施工照片

