



新北市政府 養護工程處

Maintenance Office, New Taipei City Government

三重區龍濱路(龍門路-長樂街) 兩側人行道改善工程

施工動態說明

中 華 民 國 1 1 5 年 7 月

工程基本資料

本案屬內政部國土管理署-永續提升人行安全計畫

工程名稱：三重區龍濱路（龍門路-長樂街）兩側人行道改善工程

主辦機關：新北市政府養護工程處

工期說明：開工：114年11月3日

設計監造：和建工程顧問股份有限公司

完工：115年8月19日

承攬廠商：福呈營造股份有限公司



工期：290日曆天

契約金額：92,470,000元



執行情形

進度說明：預定進度：89.11%
實際進度：89.54%
超前：+0.43%

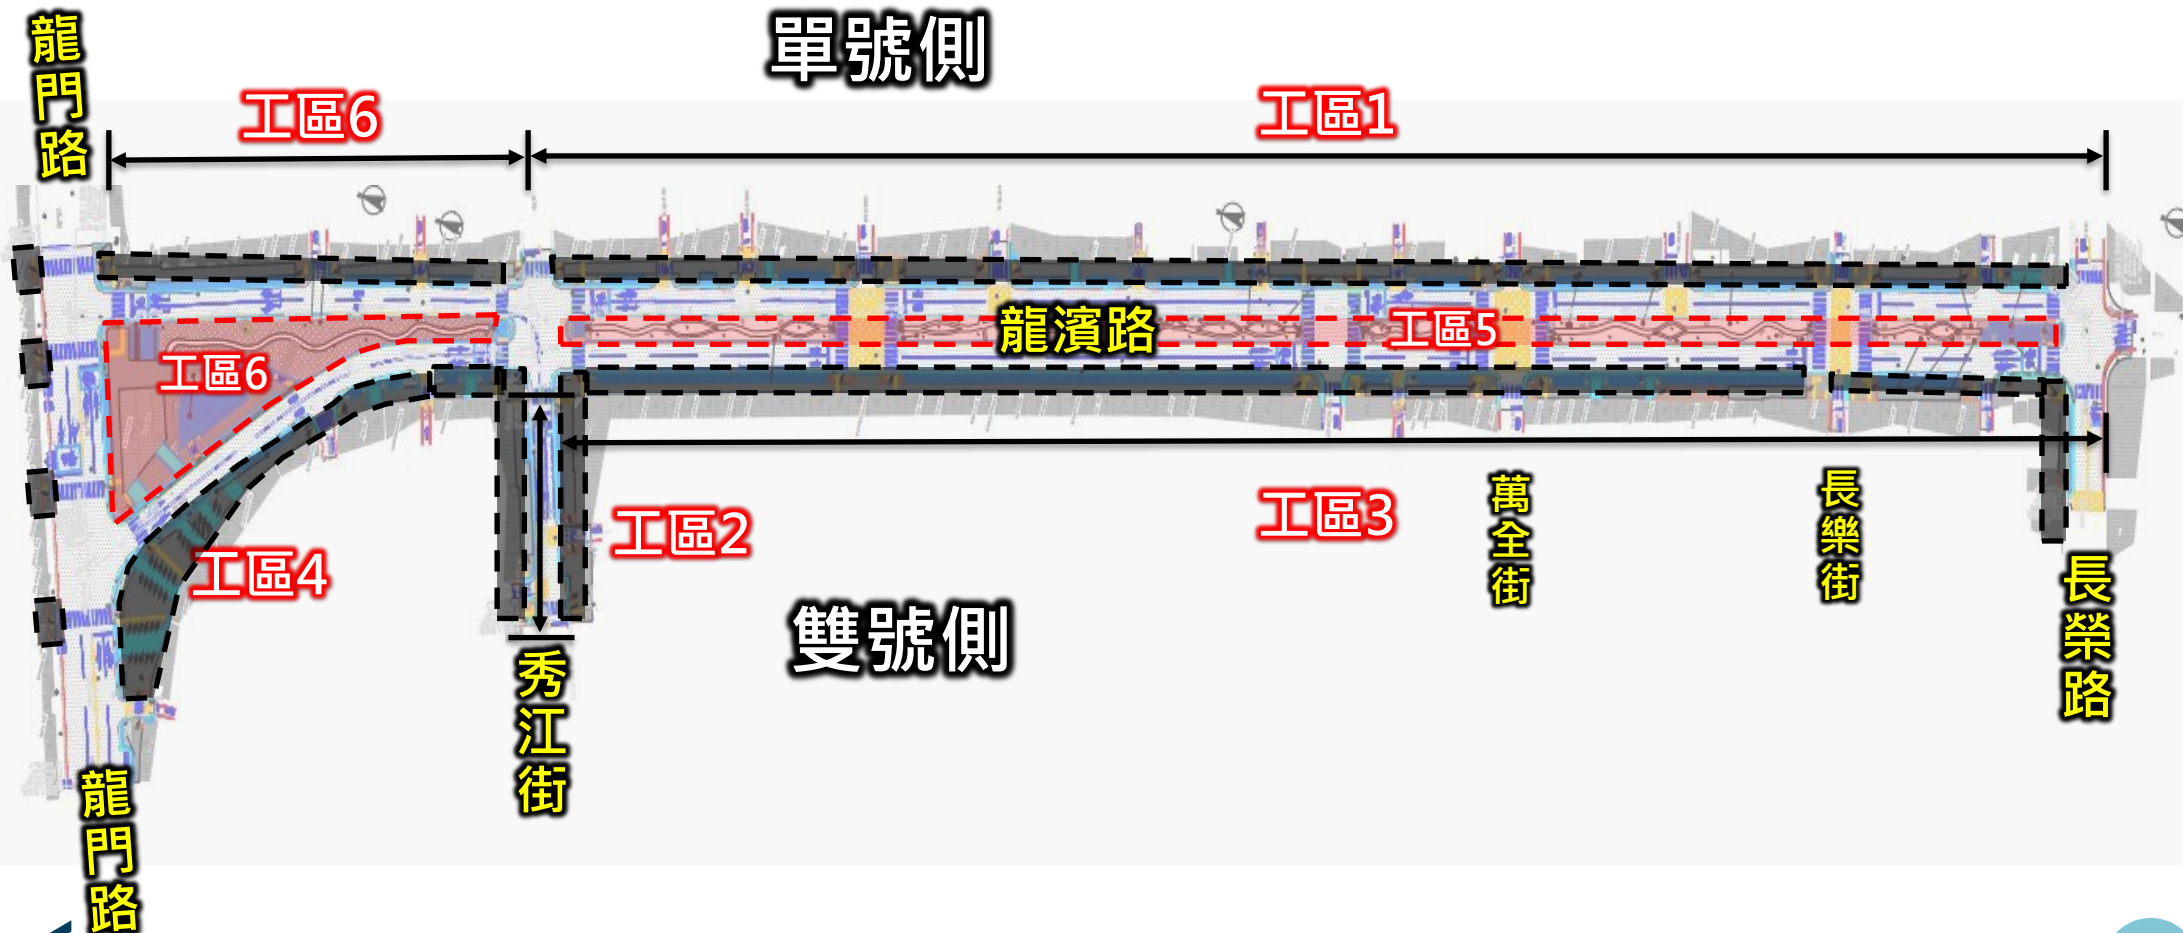

分段施工進度管控表

施工區塊	施作工項	目前進度	施工區塊	施作工項	目前進度	施工區塊	施作工項	目前進度
-1工區- 龍濱路 (秀江街~長榮路) 單號側	1.人行道打除	2/23~3/10	-2工區- 秀江街	1.人行道打除	1/20~2/10	-3工區- 龍濱路 (秀江街~長榮路) 雙號側	1.人行道打除	2/23~3/10
	2.弱電管溝	3/1~3/20		2.弱電管溝	1/10~2/10		2.弱電管溝	3/1~3/20
	3.排水施設	3/1~3/30		3.排水施設	1/15~2/13		3.排水施設	3/1~3/30
	4.人行道鋪面	3/15~4/15		4.人行道鋪面	1/15~2/13		4.人行道鋪面	3/15~4/15
-4工區- 龍濱路 (龍門路~秀江街) 雙號側	1.人行道打除	4/20~5/20	-5工區- 分隔島 (秀江街~長榮路)	分隔島改善	4/10~8/10	-6工區- 龍濱路 (龍門路~秀江街) 雙號側 分隔島 (龍門路~秀江街)	1.人行道打除	4/20~5/20
	2.弱電管溝	5/1~5/20					2.排水施設	5/10~5/30
	3.排水施設	5/10~5/30					3.人行道鋪面	5/10~5/30
	4.人行道鋪面	5/10~5/30					4.公園亮點	5/10~8/10

本週預計施作項目

- 1.地坪噴花
- 2.線燈安裝
- 3.景觀燈具、智慧共桿安裝

下週預計施作項目

- 1.塑木座以施作
- 2.植栽施作
- 3.瀝青鋪設

本月施工照片

