



新北市政府 養護工程處

Maintenance Office, New Taipei City Government

# 汐止區康寧街三期道路改善工程

施工動態說明

中華民國 113 年 9 月

# 工程基本資料

本案屬內政部國土管理署-提升道路品質計畫2.0

工程名稱：汐止區康寧街三期道路改善工程

主辦機關：新北市政府養護工程處

設計監造：和建工程顧問股份有限公司

承攬廠商：逢國營造有限公司

契約金額：20,200,000元

工期說明：開工：113年8月8日

預計完工：114年1月29日

工期：175日曆天


進度說明：預定進度15.23%

實際進度12.56%



本案範圍

# 工區目前施作狀況

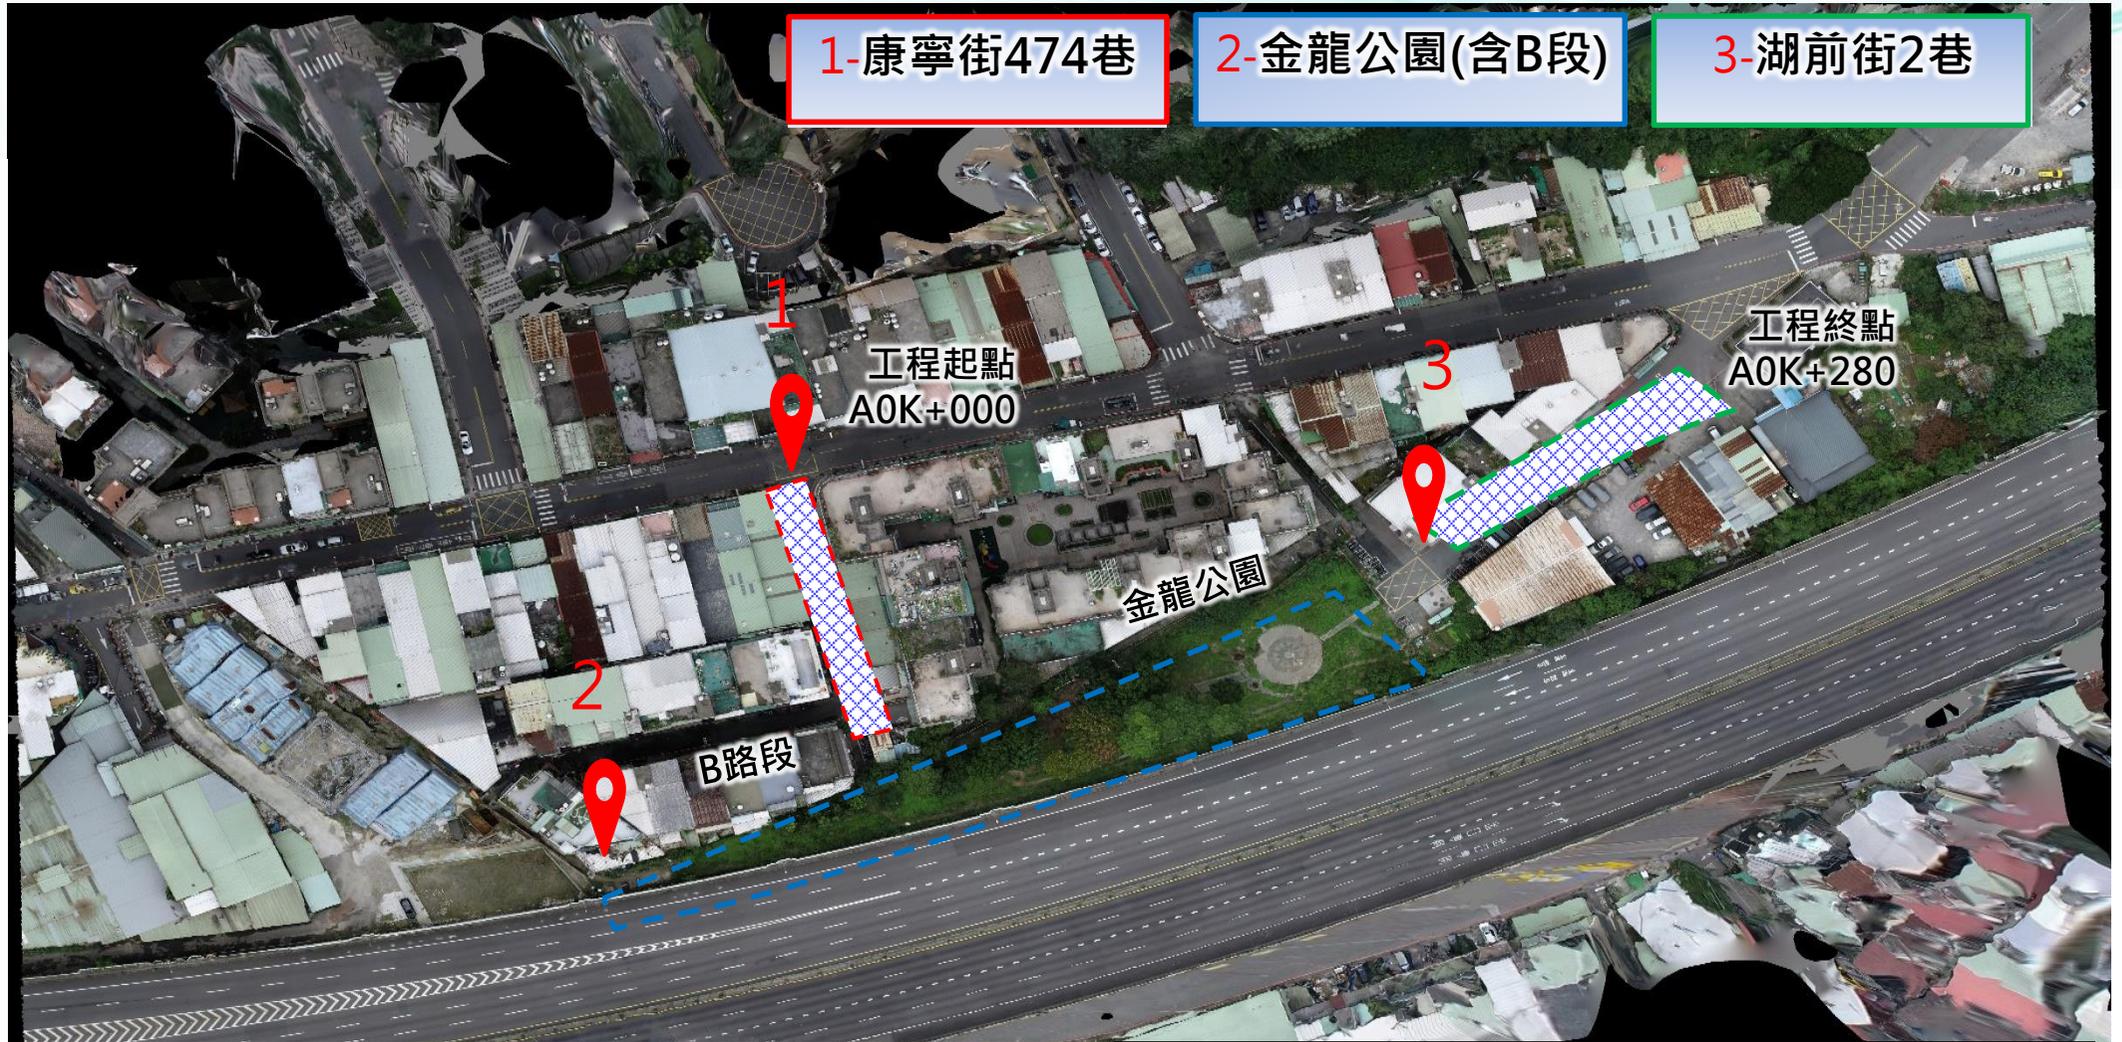

## 【本周進度】

1. 新設U7側溝施作
2. 土方及廢棄物分類
3. 474巷TYPE A及TYPE B溝蓋更新

## 【下周進度】

1. 新設U7側溝施作及U3新設側溝土方降挖
2. 土石方清運
3. 474巷TYPE A及TYPE B溝蓋更新

# 分項施工進度表

工程名稱		汐止區康寧街三期道路改善工程		
契約金額		20,200,000元		
工程內容		溝蓋板更新工程：總長約338m 新設人行道工程：總長約338m、高壓磚784.79m <sup>2</sup> 、導盲磚5.76m <sup>2</sup> 道路工程：AC刨鋪(5cm)203.08m <sup>3</sup> 、標線185.21m <sup>2</sup>		
施工分項		目前施作項目	預定下週施作項目	預定完成日期
溝蓋板更新	北側 A0K+000~065 A0K+185~250	溝蓋板更新 (A0K+000~065)	暫無	113.09.06
	南側 A0K+000~065	溝蓋板更新 (A0K+000~065)	暫無	113.09.06
新設人行道	A0K+070~180	新設U1側溝施作 新設U3側溝降挖	新設U1側溝施作 新設U3側溝降挖	114.01.20
	A0K+180~279	暫無	暫無	113.10.28
	B0K+000~057	新設U7側溝弱電管溝 施作	暫無	113.12.03
道路工程	AC銑鋪及 標線劃設	尚無	尚無	114.01.29

# 現場施工照片



U7新設側溝弱電管溝施作




U7新設側溝弱電管溝施作



U6新設側溝現況



土石方整理

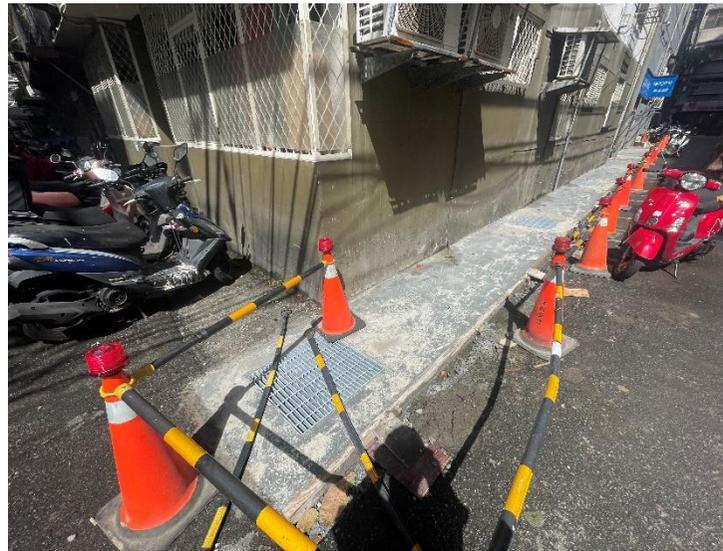

TYPE-A溝蓋板更新



TYPE-B溝蓋板更新
