



新北市政府 養護工程處

Maintenance Office, New Taipei City Government

汐止區康寧街三期道路改善工程

施工動態說明

中華民國 113 年 10 月

工程基本資料

本案屬內政部國土管理署-提升道路品質計畫2.0

工程名稱：汐止區康寧街三期道路改善工程

主辦機關：新北市政府養護工程處

設計監造：和建工程顧問股份有限公司

承攬廠商：逢國營造有限公司

契約金額：20,200,000元

工期說明：開工：113年8月8日

預計完工：114年1月29日

工期：175日曆天


進度說明：預定進度30.63%

實際進度36.33%



本案範圍

工區目前施作狀況

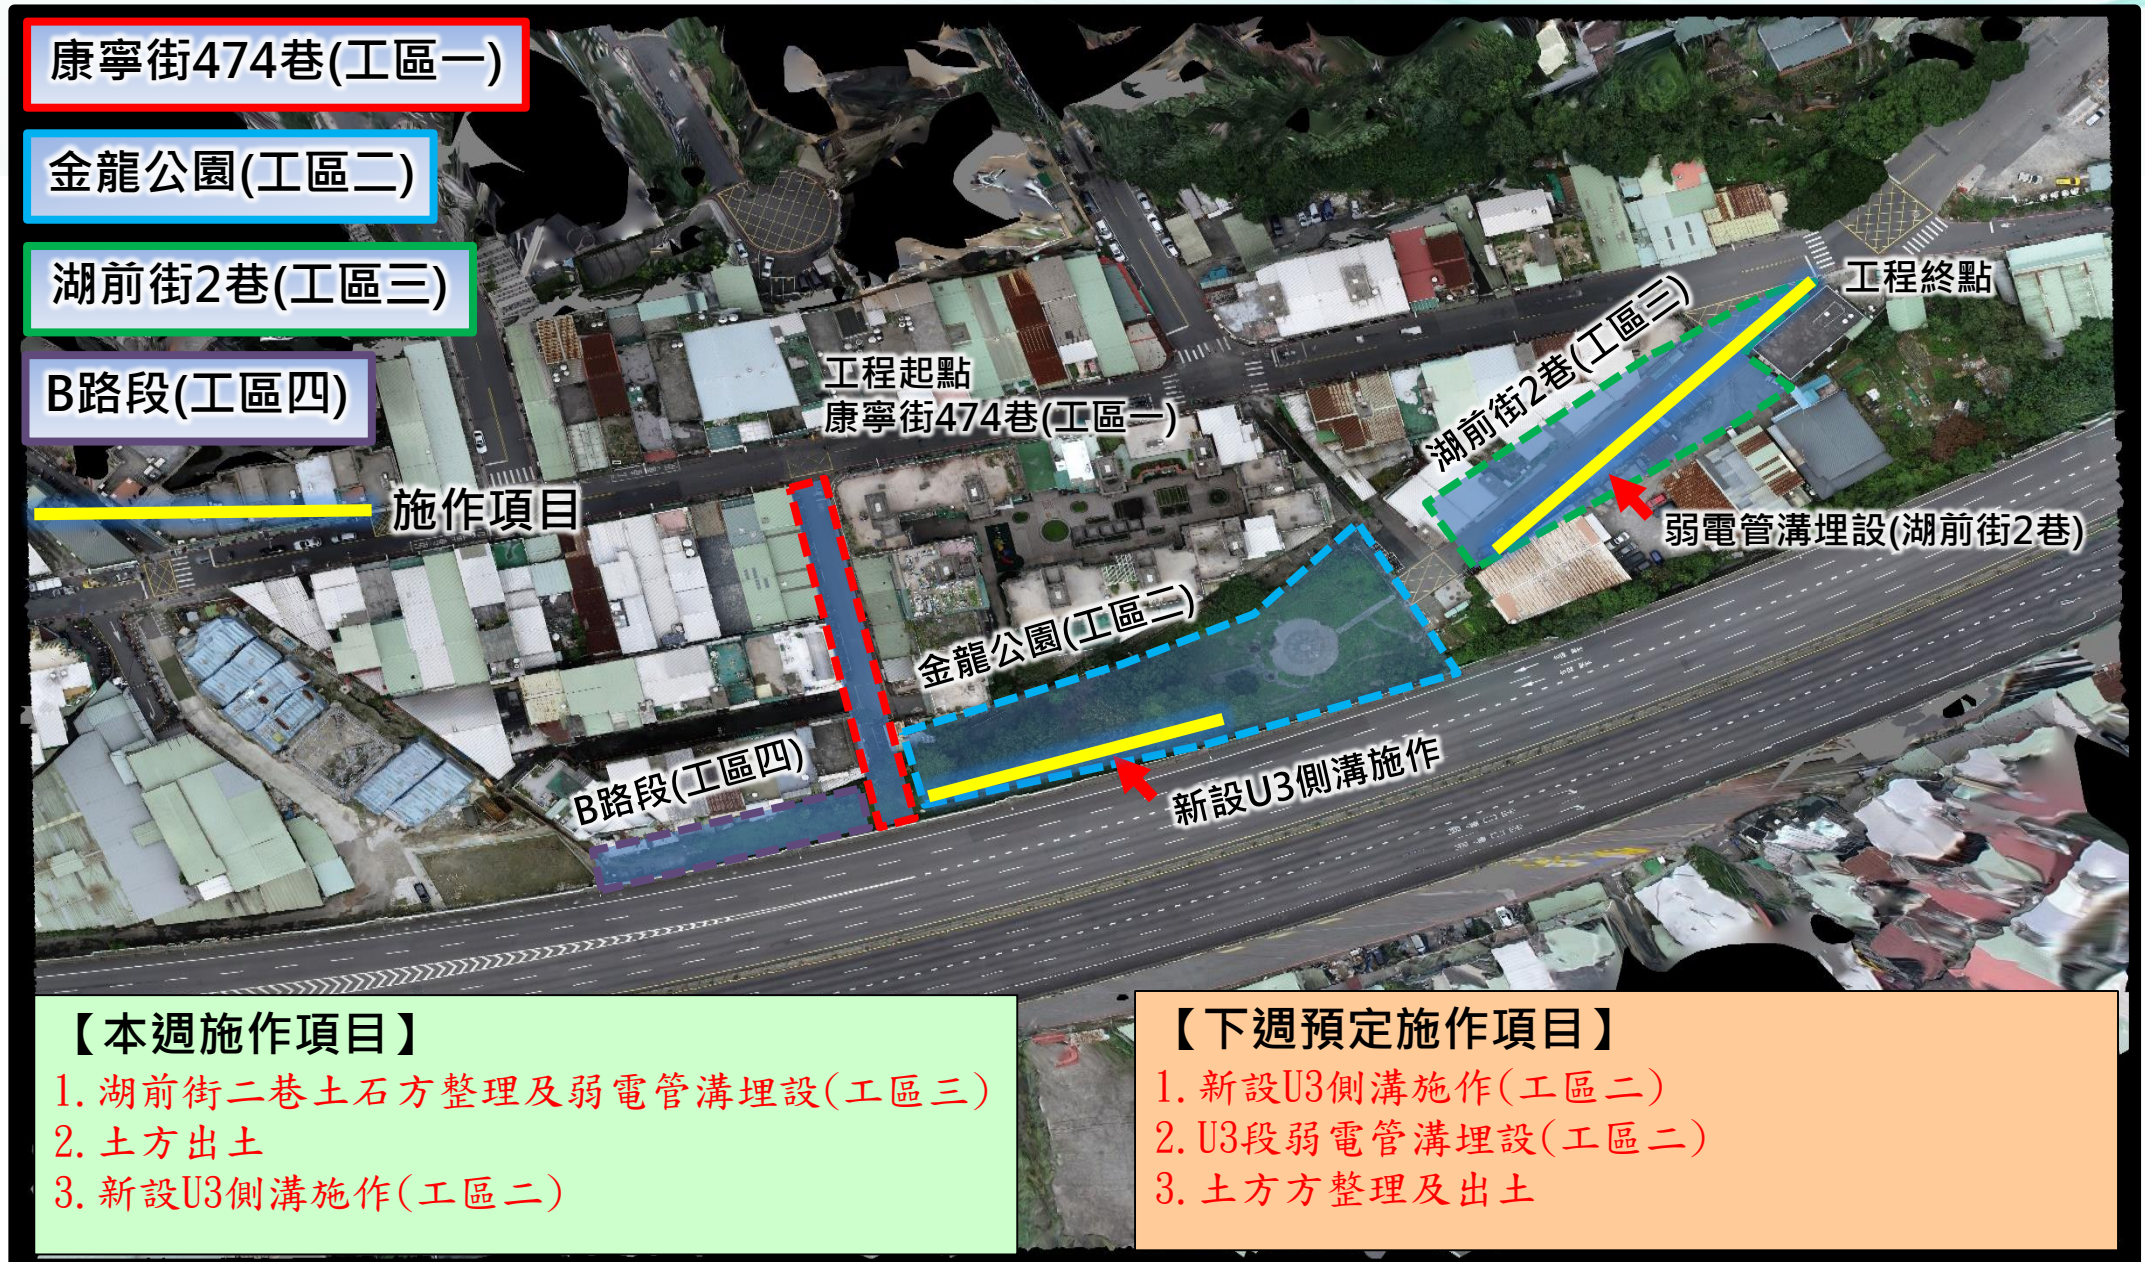

分項施工進度表

工程名稱		汐止區康寧街三期道路改善工程		
契約金額		20,200,000元		
工程內容		溝蓋板更新工程：總長約338m 新設人行道工程：總長約338m、高壓磚784.79m ² 、導盲磚5.76m ² 道路工程：AC刨鋪(5cm)203.08m ³ 、標線185.21m ²		
施工分項		目前施作項目	預定下週施作項目	預定完成日期
溝蓋板更新	北側(工區一) A0K+000~065 A0K+185~250	暫無	暫無	113.09.06
	南側(工區一) A0K+000~065	暫無	暫無	113.09.06
新設人行道	A0K+070~180 (工區二)	新設U3側溝施作	新設U3側溝施作及 弱電管溝埋設	114.01.20
	A0K+180~280 (工區三)	湖前街二巷弱電管溝 埋設	暫無	113.12.03
	B0K+000~057 (工區四)	暫無	暫無	113.12.03
道路工程	AC銑鋪及 標線劃設	尚無	尚無	114.01.29

現場施工照片



湖前街二巷土石方整理



湖前街二巷土石方整理



湖前街二巷弱電管溝埋設



新設U3側溝施作



新設U3側溝施作



新設U3側溝施作
