



新北市政府 養護工程處

Maintenance Office, New Taipei City Government

汐止區康寧街三期道路改善工程

施工動態說明

中華民國 113 年 12 月

工程基本資料

本案屬內政部國土管理署-提升道路品質計畫2.0

工程名稱：汐止區康寧街三期道路改善工程

主辦機關：新北市政府養護工程處

設計監造：和建工程顧問股份有限公司

承攬廠商：逢國營造有限公司

契約金額：20,200,000元

工期說明：開工：113年8月8日

預計完工：114年1月29日

工期：175日曆天

進度說明：預定進度58.21%

實際進度62.81%



本案範圍

工區目前施作狀況

康寧街474巷(工區一)

金龍公園(工區二)

湖前街2巷(工區三)

B路段(工區四)

施作項目

工程起點
康寧街474巷(工區一)

工程終點

湖前街2巷(工區三)

金龍公園(工區二)

B路段(工區四)

U2新設擋牆施作

A0K+120~140鋪面整理

【本週施作項目】

1. A0k+120-140鋪面整理(工區二)
2. A0k+080-135擋牆施作(工區二)
3. A0k+140-160弱電管溝埋設(工區二)
4. 過路段弱電管溝及手孔埋設

【下週預定施作項目】

1. U2新設側溝(A0K+155~170)施作(工區三)
2. U3新設側溝(A0K+160~180)施作(工區三)
3. A0K+120~160人行道結構層施作(工區二)

分項施工進度表

工程名稱		汐止區康寧街三期道路改善工程		
契約金額		20,200,000元		
工程內容		溝蓋板更新工程：總長約338m 新設人行道工程：總長約338m、高壓磚784.79m ² 、導盲磚5.76m ² 道路工程：AC刨鋪(5cm)203.08m ³ 、標線185.21m ²		
施工分項		目前施作項目	預定下週施作項目	預定完成日期
溝蓋板更新	北側(工區一) A0K+000~065 A0K+185~250	暫無	暫無	113.09.06
	南側(工區一) A0K+000~065	暫無	暫無	113.09.06
新設人行道	A0K+070~180 (工區二)	A0k+120-140鋪面整理 A0k+080-135擋牆施作 A0k+140-160弱電管溝埋設	A0K+120~160人行道結構層施作	114.01.20
	A0K+180~280 (工區三)	暫無	U3新設側溝(A0K+160~180)施作	114.01.29
	B0K+000~057 (工區四)	暫無	暫無	113.12.03
道路工程	AC銑鋪及標線劃設	尚無	尚無	114.01.29

現場施工照片




湖前街二巷高壓磚鋪設



湖前街二巷高壓磚鋪設



湖前街二巷高壓磚鋪設

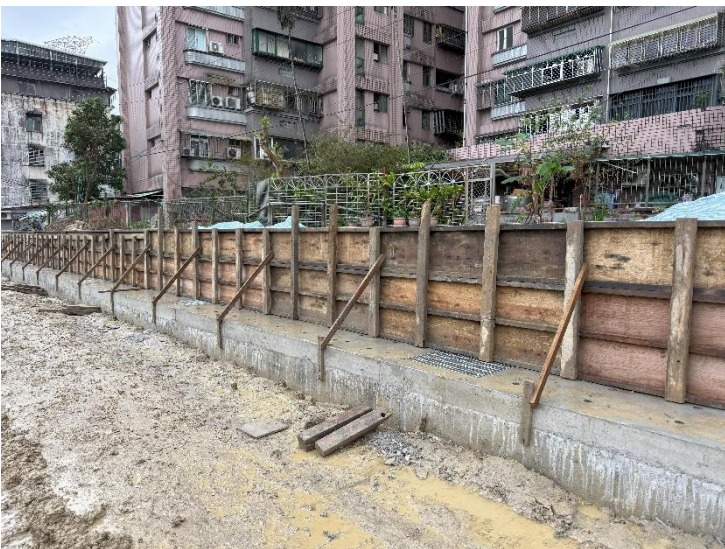

U2新設擋牆施作



U2新設擋牆施作



U2新設擋牆施作
