



新北市政府 養護工程處

Maintenance Office, New Taipei City Government

汐止區康寧街三期道路改善工程

施工動態說明

中華民國 114 年 1 月

工程基本資料

本案屬內政部國土管理署-提升道路品質計畫2.0

工程名稱：汐止區康寧街三期道路改善工程

主辦機關：新北市政府養護工程處

設計監造：和建工程顧問股份有限公司

承攬廠商：逢國營造有限公司

契約金額：20,200,000元

工期說明：開工：113年8月8日

預計完工：114年3月9日

(工期展延39天)

工期：214(175+39)日曆天

進度說明：預定進度58.84%

實際進度69.66%



本案範圍

工區目前施作狀況

康寧街474巷(工區一)

金龍公園(工區二)

湖前街2巷(工區三)

B路段(工區四)

施作項目

工程起點
康寧街474巷(工區一)

湖前街2巷(工區三)

工程終點

金龍公園(工區二)

B路段(工區四)

路緣石排設及UBIKE整地

【本週施作項目】

1. 湖前街二巷路緣石排設(工區三)
2. 湖前街二巷YOUBIKE整地(工區三)

【下週預定施作項目】

1. 0K+240~275溝蓋板施作(工區三)
2. 0k+185~195路緣石排設(工區三)

分項施工進度表

工程名稱		汐止區康寧街三期道路改善工程		
契約金額		20,200,000元		
工程內容		溝蓋板更新工程：總長約338m 新設人行道工程：總長約338m、高壓磚784.79m ² 、導盲磚5.76m ² 道路工程：AC銑鋪(5cm)203.08m ³ 、標線185.21m ²		
施工分項		目前施作項目	預定下週施作項目	預定完成日期
溝蓋板更新	北側(工區一) A0K+000~065 A0K+185~250	暫無	暫無	114.03.09
	南側(工區一) A0K+000~065	暫無	暫無	114.03.09
新設人行道	A0K+070~180 (工區二)	暫無	暫無	114.03.09
	A0K+180~280 (工區三)	1. 湖前街二巷路緣石排設 2. 湖前街二巷YOUUBIKE整地	1. 0K+240~275溝蓋板施作 2. 0k+185~195路緣石排設	114.03.09
	B0K+000~057 (工區四)	暫無	暫無	114.03.09
道路工程	AC銑鋪及標線劃設	尚無	尚無	114.03.09

現場施工照片



湖前街二巷路緣石排設



湖前街二巷路緣石排設




湖前街二巷現況



湖前街二巷現況



湖前街二巷現況

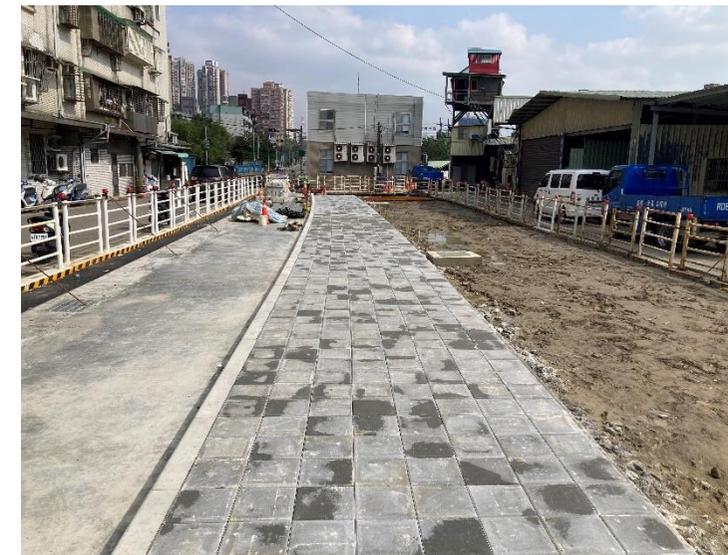

湖前街二巷現況
