



新北市政府 養護工程處

Maintenance Office, New Taipei City Government

汐止區康寧街三期道路改善工程

施工動態說明

中華民國 114 年 5 月

工程基本資料

本案屬內政部國土管理署-提升道路品質計畫2.0

工程名稱：汐止區康寧街三期道路改善工程

主辦機關：新北市政府養護工程處

設計監造：和建工程顧問股份有限公司

承攬廠商：逢國營造有限公司

契約金額：20,200,000元

工期說明：開工：113年8月8日

預計完工：114年5月8日

工期：274(175+99)日曆天

進度說明：預定進度100%

實際進度100%



本案範圍

工區目前施作狀況



分項施工進度表

工程名稱		汐止區康寧街三期道路改善工程		
契約金額		20,200,000元		
工程內容		溝蓋板更新工程：總長約338m 新設人行道工程：總長約338m、高壓磚784.79m ² 、導盲磚5.76m ² 道路工程：AC刨鋪(5cm)203.08m ³ 、標線185.21m ²		
施工分項		目前施作項目	預定下週施作項目	預定完成日期
溝蓋板更新	北側(工區一) A0K+000~065 A0K+185~250	已完成	無	113.10.25
	南側(工區一) A0K+000~065	已完成	無	113.10.25
新設人行道	A0K+070~180 (工區二)	已完成	無	114.05.04
	A0K+180~280 (工區三)	已完成	無	114.05.04
	B0K+000~057 (工區四)	已完成	無	114.05.04
道路工程	AC銑鋪及 標線劃設	已完成	無	114.05.08

工區照片




人行道鋪設完成



人行道鋪設完成



變電箱油漆完成

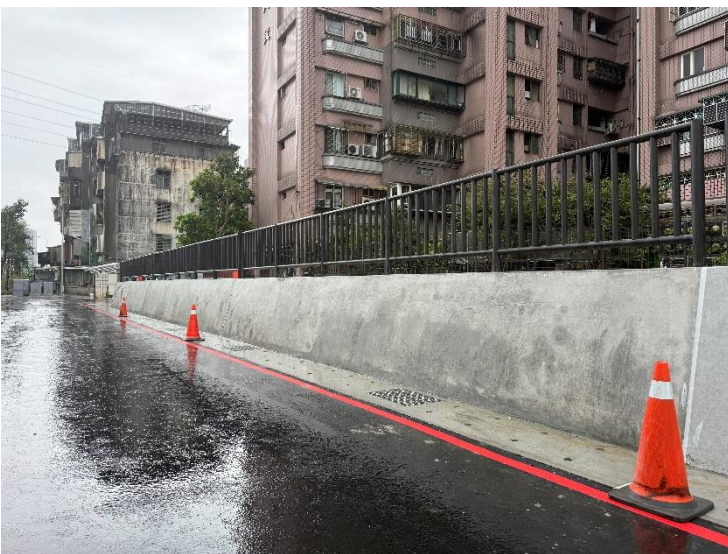

道路鋪設完成



人行道鋪設完成



智慧共桿安裝完成
