



新北市政府 養護工程處

Maintenance Office, New Taipei City Government

# 112年度提升道路品質計畫新北市人行環境改善工程(第1標)- 三重區新北高中周遭人行及通學環境改善工程

## 施工動態說明

中華民國 1 1 2 年 1 0 月

# 工程基本資料 (本案屬新北市工務局道路品質提升計畫)

工程名稱：112年度提升道路品質計畫新北市人行環境改善工程(第1標)-  
三重區新北高中周遭人行及通學環境改善工程

主辦機關：新北市政府養護工程處

設計監造：和建工程顧問股份有限公司

承攬廠商：北翰營造有限公司

契約金額：30,050,000元


工期說明：開工：112年7月15日

預計完工：113年4月9日

工期：270日曆天

進度說明：預定進度17.70%

實際進度21.32%

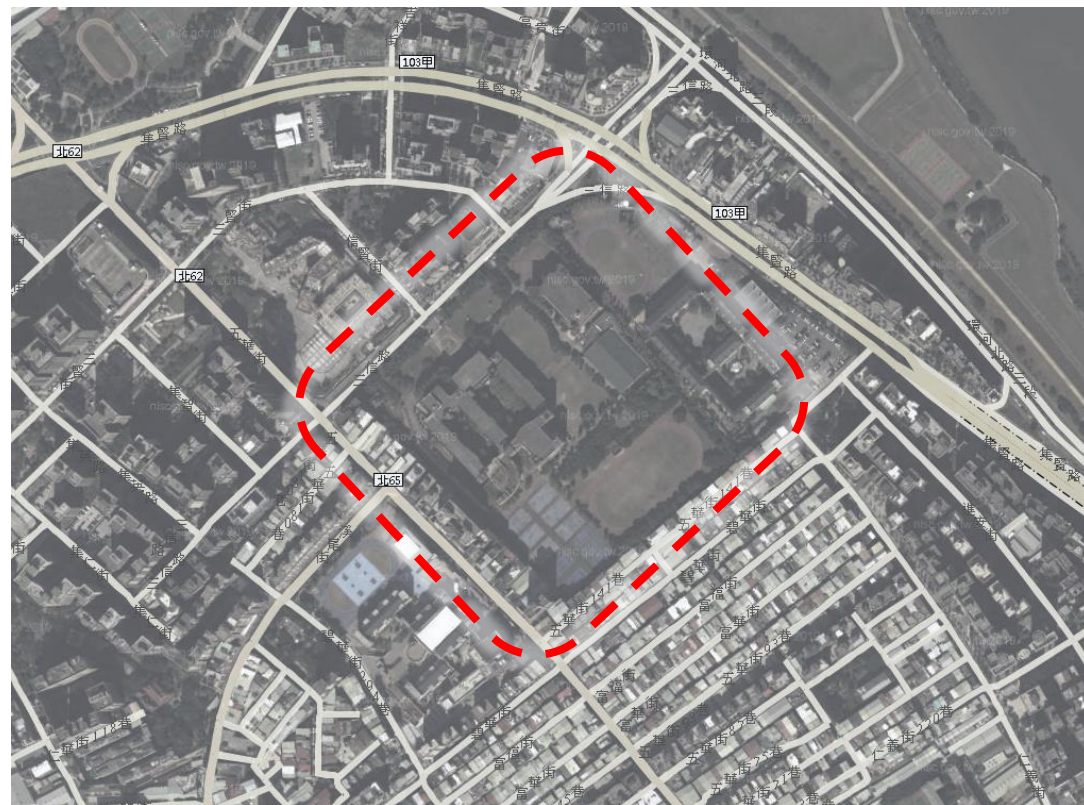

本案範圍




# 工區目前施作狀況

★ 現在施作位置

A工區 - 五華街東、西側

B工區-三信路

C工區-三信路支線

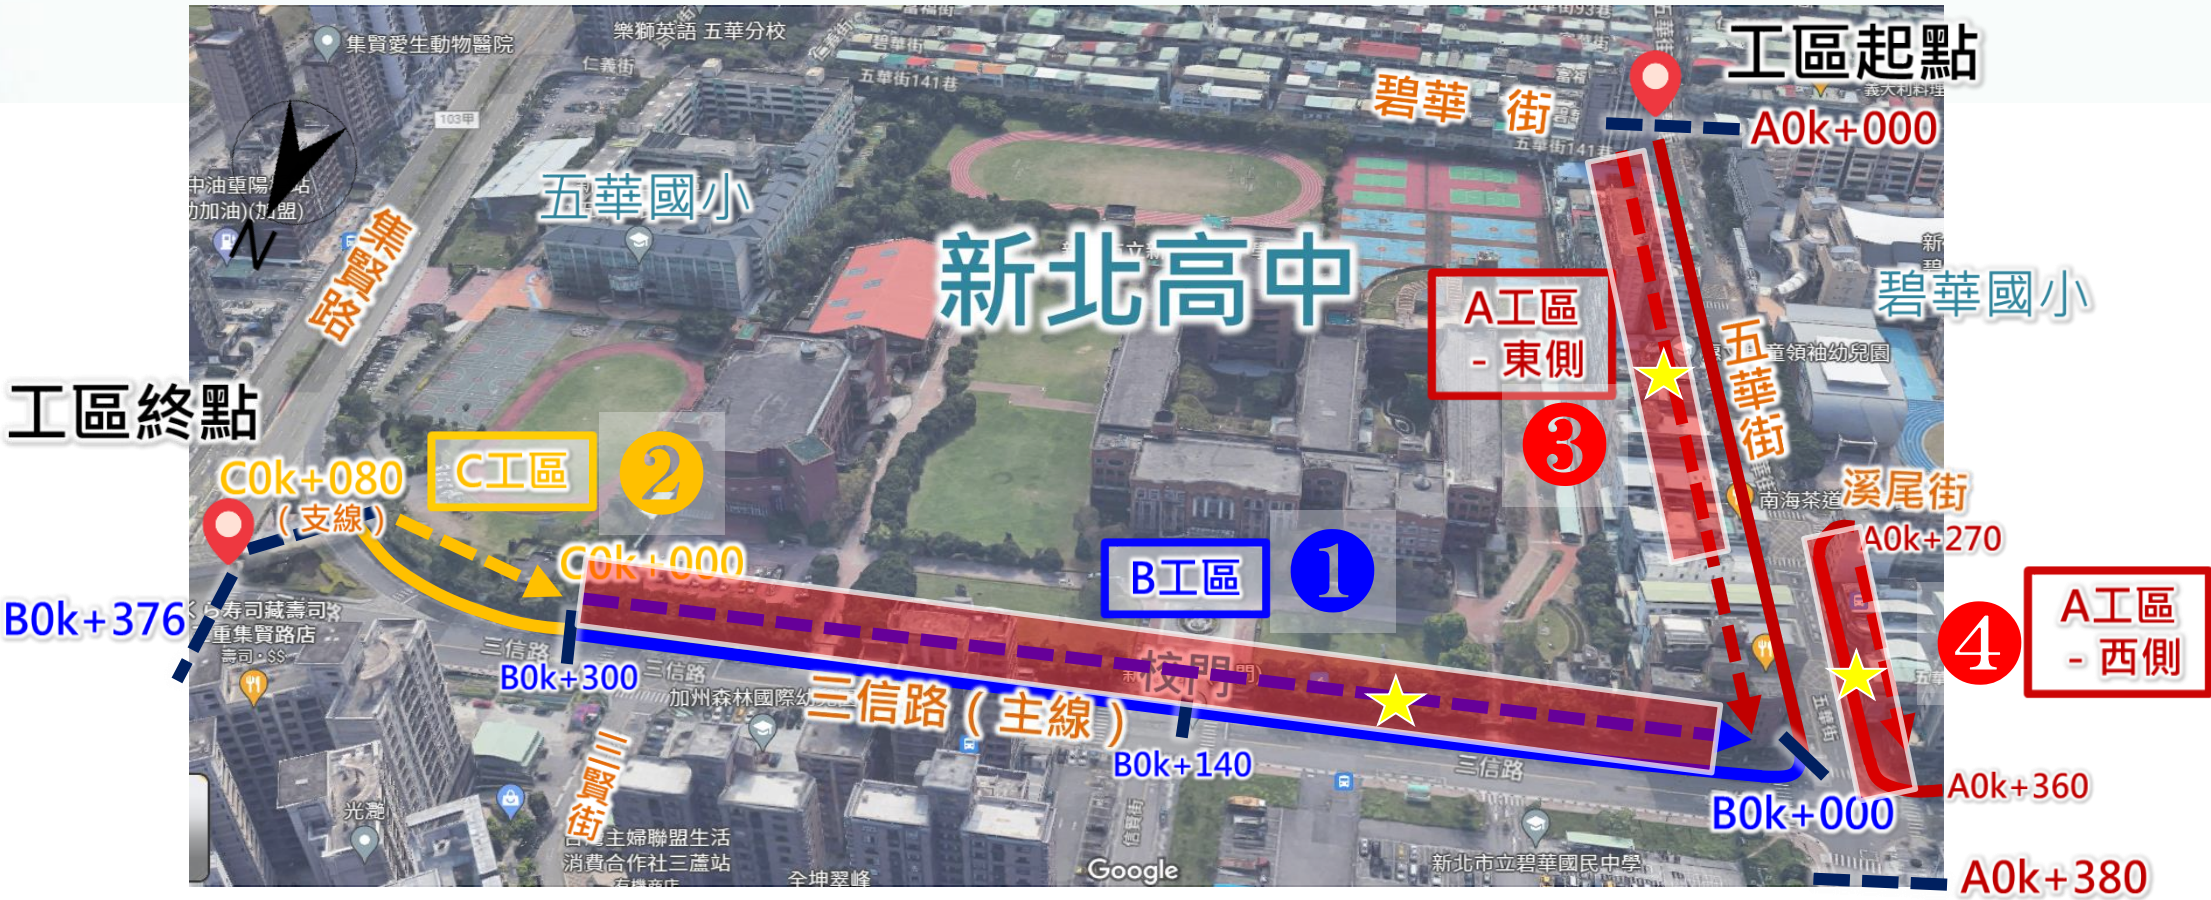

本案施工範圍：三信路(B工區)、五華街(A工區)、三信路支線(C工區)

他案施工範圍：捷工局(捷運站)、高灘處(陸橋)、交通局(候車亭)、自來水(供水管更換) 區公所(道路重劃)

# 分段施工進度報表

工程名稱		三重區新北高中周遭人行及通學環境改善工程		
契約金額		30,050,000元		
工程內容		<p>人行道工程：高壓磚1,685m<sup>2</sup>、弱電管溝979m、景觀高燈16盞</p> <p>排水工程：溝頂板更新657m、洩水板407m、收水井87顆</p> <p>景觀工程：植栽帶470m<sup>2</sup>、喬木移植22株、灌木1,480株、草皮348m<sup>2</sup></p> <p>路面工程：路改149m<sup>2</sup>、AC銑鋪7,636m<sup>2</sup>、標線1,093m<sup>2</sup></p>		
施工分區		目前進度	預定下週施作項目	預定完成日期 (開放行人通行)
第1階段	工區C (三信路支線)	-	-	已開放通行 (配合孩童接送區)
	工區B(三信路主線) (至校門前)	-	(待磚面材料進場後鋪設)	預計10/31開放 (待磚面)
第2階段	工區B(三信路主線) (校門至五華街)	1.路面破碎 2.剩餘土石方處理清運	1.路面破碎 2.剩餘土石方處理清運	預計12/01開放
第3階段	工區A(五華街東側) 0k+000~0k+260	1.路緣石、洩水板 2.磚面鋪設 3.剩餘土石方處理清運 4.共同管溝及引上管	1.路緣石、洩水板 2.磚面鋪設 3.剩餘土石方處理清運	預計12/21開放
第4階段	工區A(五華街西側) 0k+270~0k+360	1.路緣石 2.集水井及洩水板	1.路緣石 2.集水井及洩水板 3.磚面鋪設 4.剩餘土石方處理清運	預計1/31開放 (113年度)



# 現場施工照片 (A+B工區)



人行道工程-高程放樣




人行道工程-混凝土灌漿



人行道工程-高壓磚、水泥砂漿



人行道工程-水線放樣

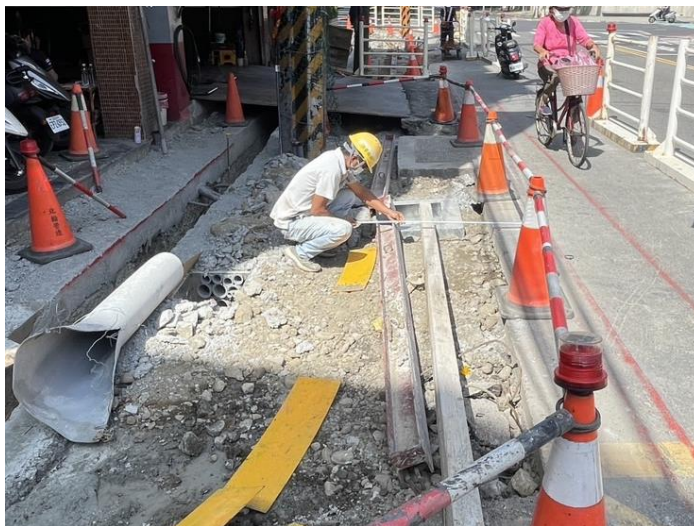

人行道工程-路緣石放樣



交維-土方出車
