



新北市政府 養護工程處

Maintenance Office, New Taipei City Government

112年度提升道路品質計畫新北市人行環境改善工程(第1標)- 三重區新北高中周遭人行及通學環境改善工程

施工動態說明

中華民國 1 1 2 年 0 7 月

工程基本資料 (本案屬新北市工務局道路品質提升計畫)

工程名稱：112年度提升道路品質計畫新北市人行環境改善工程(第1標)-
三重區新北高中周遭人行及通學環境改善工程

主辦機關：新北市政府養護工程處

設計監造：和建工程顧問股份有限公司


承攬廠商：北翰營造有限公司

契約金額：30,050,000元

工期說明：開工：112年7月15日
預計完工：113年4月9日

工期：270日曆天

進度說明：預定進度0.65%
實際進度1.43%

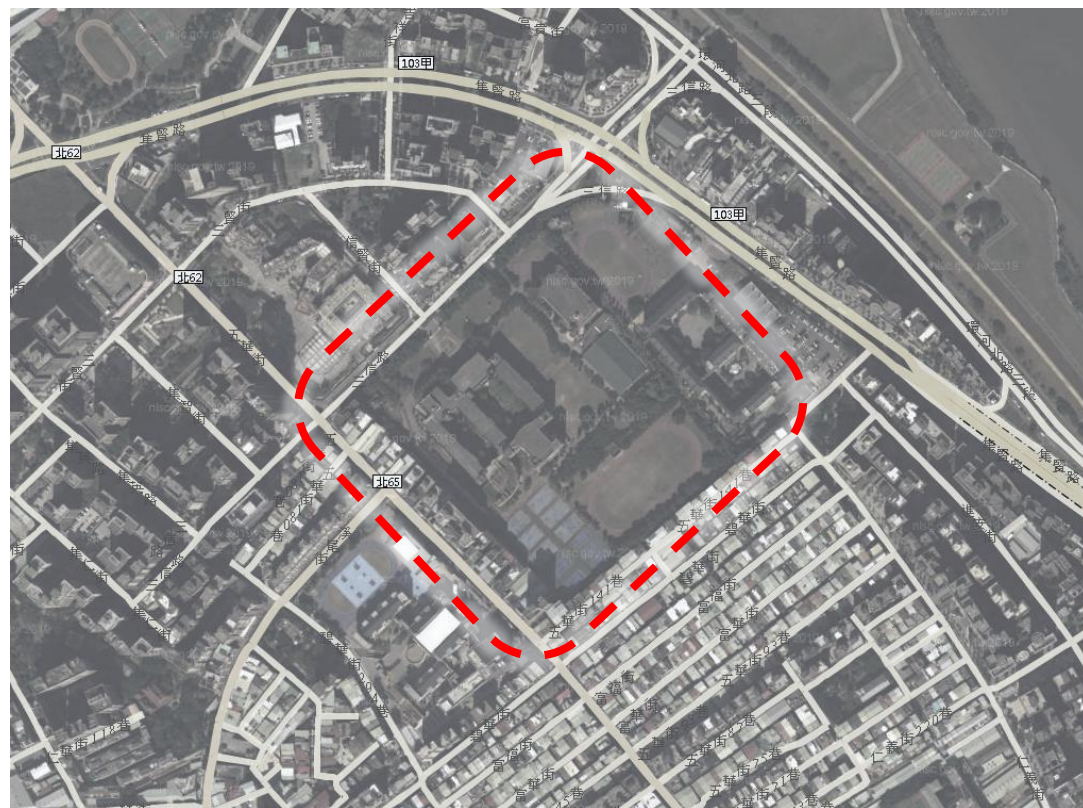

本案範圍

工區目前施作狀況



本案施工範圍：三信路(B工區)、五華街(A工區)、三信路支線(C工區)

他案施工範圍：捷工局(捷運站)、高灘處(陸橋)、交通局(候車亭)、自來水(供水管更換) 區公所(道路重劃)

分段施工進度報表

工程名稱		三重區新北高中周遭人行及通學環境改善工程		
契約金額		30,050,000元		
工程內容		人行道工程：高壓磚1,685m ² 、弱電管溝979m、景觀高燈16盞 排水工程：溝頂板更新657m、洩水板407m、收水井87顆 景觀工程：植栽帶470m ² 、喬木移植22株、灌木1,480株、草皮348m ² 路面工程：路改149m ² 、AC銑鋪7,636m ² 、標線1,093m ²		
施工分區		目前進度	預定下週施作項目	預定完成日期 (開放行人通行)
第1階段	工區C (三信路支線)	磚面破碎及清運 防颱預防措施	弱電管溝開挖	預計08/28開放
	工區B (三信路主線) (至校門前)	磚面破碎及清運 過路管埋設及弱電管溝開挖 防颱預防措施	土石方分類 弱電管溝開挖	預計8/31開放
第2階段	工區B (三信路主線) (校門至五華街)	無	無	預計11/26開放
第3階段	工區A (五華街東側)	無	無	預計2/24開放 (113年度)
第4階段	工區A (五華街西側)	無	無	預計3/25開放 (113年度)

現場施工照片 (C工區)



既有人行道磚面開挖



過管埋線開挖



舊有洩水板開挖



過路管線埋設



既有人行道磚面開挖



施工範圍預留人行通道
