



新北市政府 養護工程處

Maintenance Office, New Taipei City Government

110年度提升道路品質計畫新北市人行環境改善工程(第12標)

新北市三鶯文創整合計畫

「館前路人本友善暨藝術廊道再造工程」

施工動態說明

中華民國111年6月4日

工程基本資料

(本案屬新北市工務局規劃鶯歌四藝徑-「藝」字路徑)

工程名稱：110年度提升道路品質計畫新北市人行環境改善工程(第12標)

-新北市三鶯文創整合計畫「館前路人本友善暨藝術廊道再造工程」

主辦機關：新北市政府養護工程處

設計監造：和建工程顧問股份有限公司

承攬廠商：逢國營造有限公司

契約金額：7,098萬元

工期說明：開工：111年2月11日

預計完工：111年8月9日

工期：180日曆天

進度說明：預定進度22.55%

實際進度23.67%

進度超前：+1.12%(截至111年5月31日)



工區目前施作狀況



本案施工範圍：北側人行道(第一工區)、南側人行道(第二工區+第三工區)

他案施工範圍：捷工局(捷運站+空橋)、新工處(美術館+落客平台)
交通局(三鶯轉運站+候車亭)、自來水(供水管更換)

現場施工照片 (第一工區-北側人行道0K+000-0K+390)



新設側溝高程測量



新設側溝頂板及緣石排放



新設側溝施作完成



人行道結構層銲接網鋪設



人行道結構層混凝土澆置



人行道結構層覆蓋養護

現場施工照片 (第二工區-南側人行道0K+000-0K+420)




側溝溝蓋板免拆模板鋪設



側溝溝蓋板鑽孔植筋



側溝溝蓋板混凝土澆置

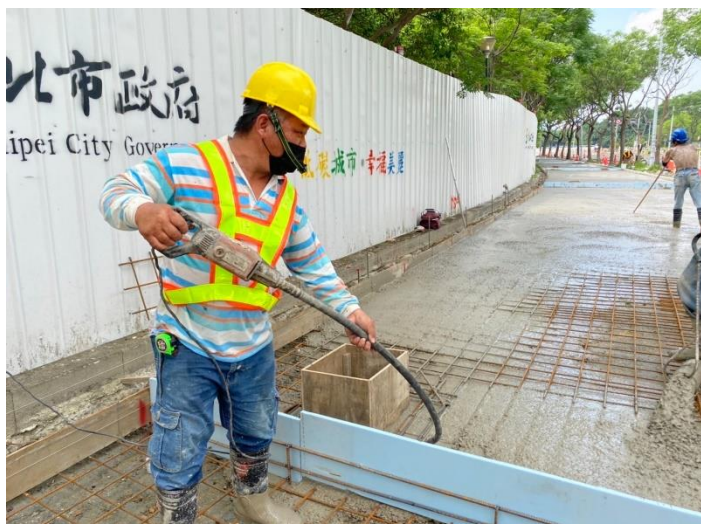

人行道結構層混凝土澆置



人行道結構層覆蓋養護



人行道環保高壓磚鋪設

現場施工照片 (第三工區-北側人行道0K+420-0K+820)




圍籬拆除及再生級配整理




新設擋土牆基礎開挖



新設擋土牆造型模組立

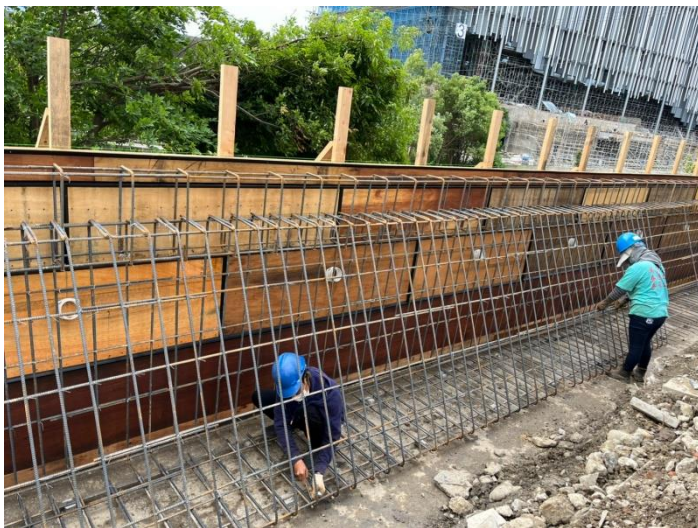

新設擋土牆鋼筋綁紮組立

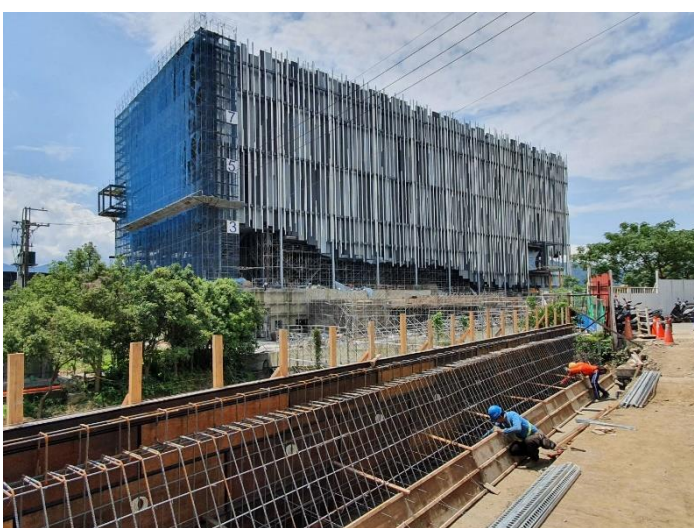

新設擋土牆內模組立



新設擋土牆洩水管安裝
