



新北市政府 養護工程處

Maintenance Office, New Taipei City Government

110年度提升道路品質計畫新北市人行環境改善工程(第12標)

新北市三鶯文創整合計畫

「館前路人本友善暨藝術廊道再造工程」

施工動態說明

中華民國111年8月3日

工程基本資料

(本案屬新北市工務局規劃鶯歌四藝徑-「藝」字路徑)

工程名稱：110年度提升道路品質計畫新北市人行環境改善工程(第12標)

—新北市三鶯文創整合計畫「館前路人本友善暨藝術廊道再造工程」

主辦機關：新北市政府養護工程處

設計監造：和建工程顧問股份有限公司

承攬廠商：逢國營造有限公司

契約金額：7,098萬元

工期說明：開工：111年2月11日

預計完工：111年9月9日

(工期展延31天)

工期：211(180+31)日曆天

進度說明：預定進度51.80%

實際進度52.15%

進度超前：+0.35%(截至111年7月31日)



工區目前施作狀況



本案施工範圍：北側人行道(第一工區)、南側人行道(第二工區+第三工區)

他案施工範圍：捷工局(捷運站+空橋)、新工處(美術館+落客平台)
交通局(三鶯轉運站+候車亭)、自來水(供水管更換)

現場施工照片 (第一工區-北側人行道0K+000-0K+390)



南靖橋既有伸縮縫拆除



伸縮縫安裝與配筋




早強無收縮水泥澆置



弱電管溝施作



陶博館前側溝蓋施作

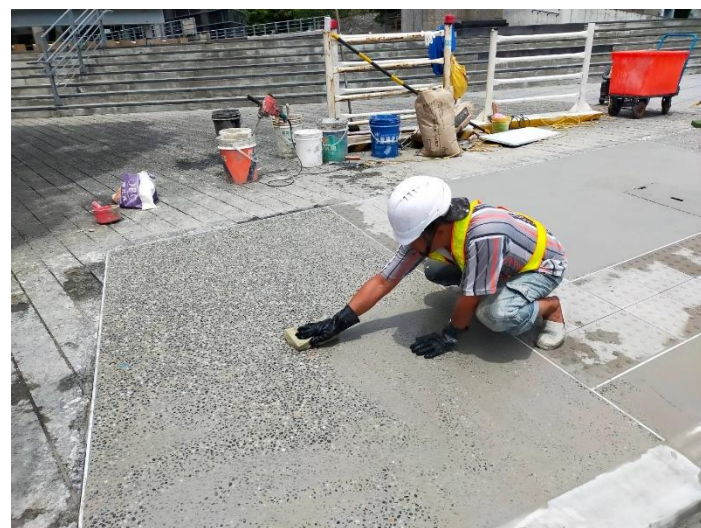

陶博館前斜坡道施作

現場施工照片 (第二工區-南側人行道0K+000-0K+420)



路口洩水板施作




路口斜坡道施作



洩水板濕潤養治



斜坡道振石子

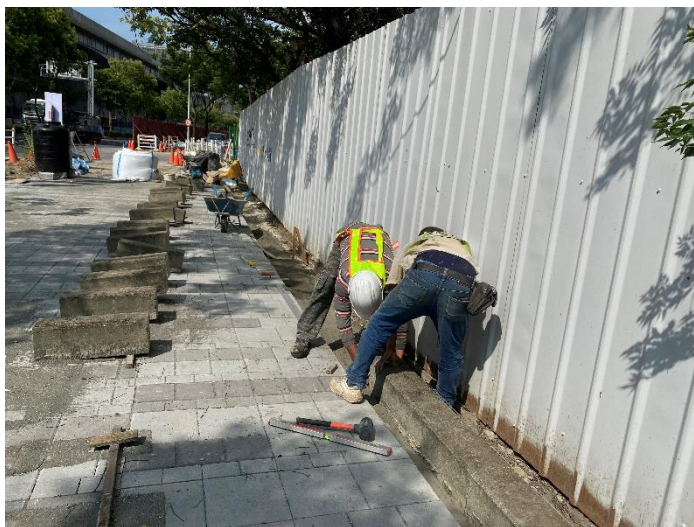


既有樹圍石調整



整體人行道成果


現場施工照片 (第三工區-北側人行道OK+420-0K+820)

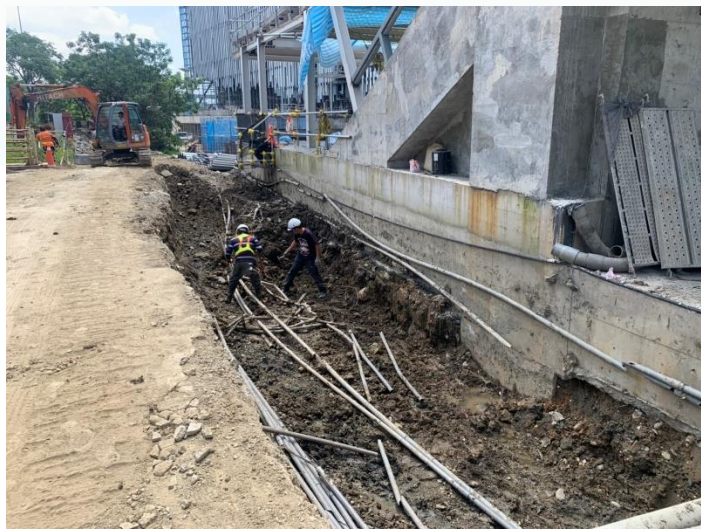

新設擋土牆開挖與管障清除




高程測量與放樣

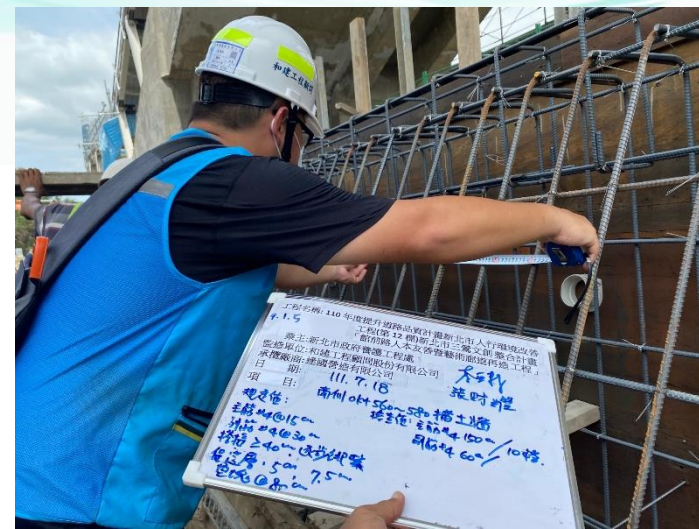

鋼筋組立與施工抽查



第一升層模板組立與灌漿

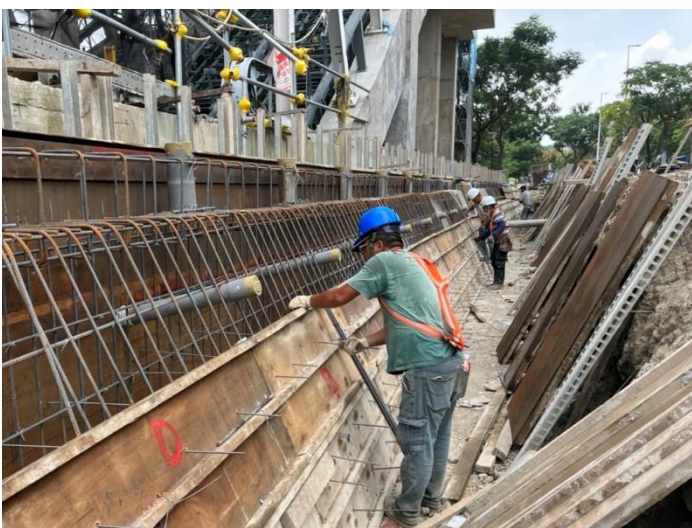

第二升層模板組立



模板組立完成
