



新北市政府 養護工程處

Maintenance Office, New Taipei City Government

110年度提升道路品質計畫新北市人行環境改善工程(第12標)

新北市三鶯文創整合計畫

「館前路人本友善暨藝術廊道再造工程」

施工動態說明

中華民國111年9月3日

# 工程基本資料

(本案屬新北市工務局規劃鶯歌四藝徑-「藝」字路徑)

工程名稱：110年度提升道路品質計畫新北市人行環境改善工程(第12標)

-新北市三鶯文創整合計畫「館前路人本友善暨藝術廊道再造工程」

主辦機關：新北市政府養護工程處

設計監造：和建工程顧問股份有限公司

承攬廠商：逢國營造有限公司

契約金額：7,098萬元

工期說明：開工：111年2月11日

預計完工：111年9月9日

(工期展延31天)

工期：211(180+31)日曆天

進度說明：預定進度80.68%

實際進度81.02%

進度超前：+0.34%(截至111年8月31日)





# 工區目前施作狀況



**本案施工範圍：**北側人行道(第一工區)、南側人行道(第二工區+第三工區)


**他案施工範圍：**捷工局(捷運站+空橋)、新工處(美術館+落客平台)  
交通局(三鶯轉運站+候車亭)、自來水(供水管更換)



# 現場施工照片 (第一工區-北側人行道0K+000-0K+390)



噴花地坪結構施作

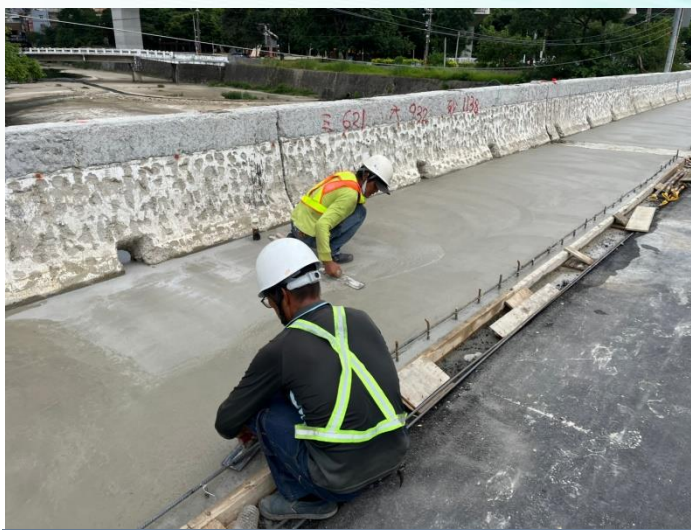

噴花地坪結構混凝土澆置



噴花地坪結構混凝土養治



防護欄杆與基礎施作



造型帆影欄杆螺栓預鑽孔




造型帆影欄杆安裝



# 現場施工照片 (第二工區-南側人行道0K+000-0K+420)



斜坡道振石子

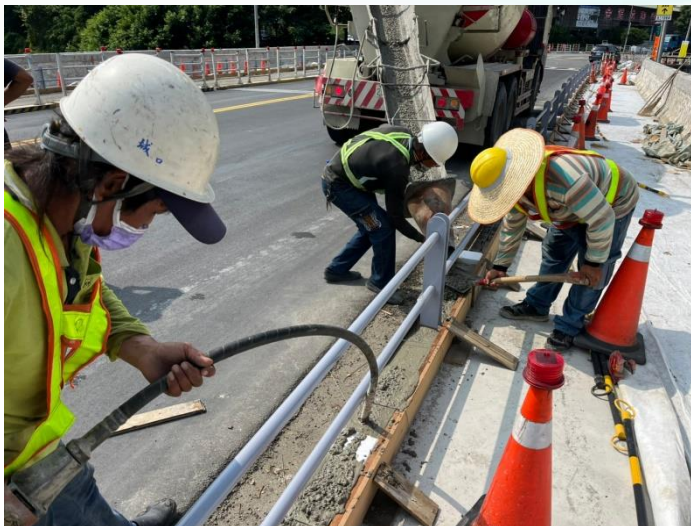


防護欄杆與基礎施作



防護欄杆安裝校正



植栽種植範圍放樣

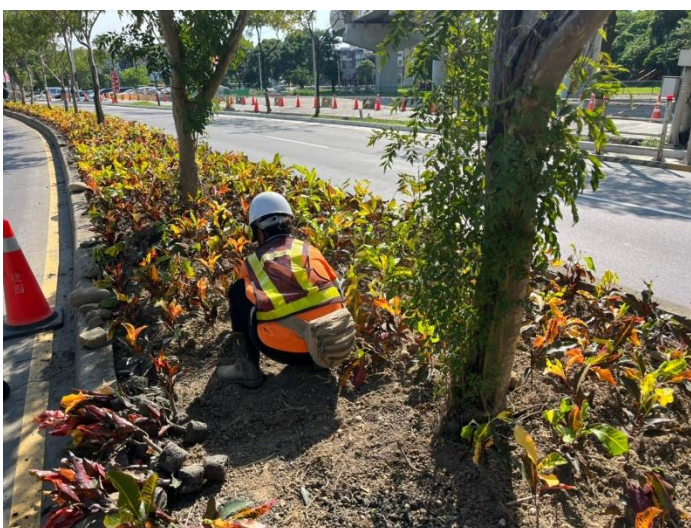

分隔島植栽種植



人行道植栽帶種植



# 現場施工照片 (第三工區-北側人行道0K+420-0K+820)



捷運空橋段側溝施作




避車彎人行道結構施作



人行道結構及外側回填



環保高壓磚鋪設

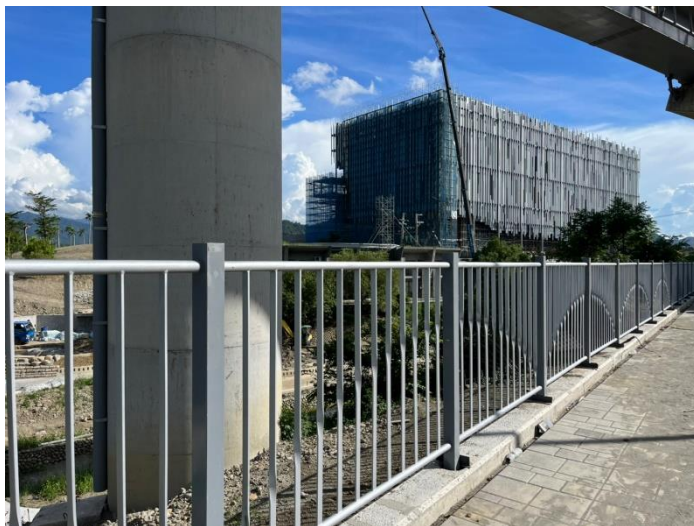

擋土牆造型欄杆安裝



植栽帶植栽種植
