



新北市政府 養護工程處

Maintenance Office, New Taipei City Government

# 新北市政府前廣場周遭人行環境 改善工程

## 施工動態說明

中華民國 114 年 06 月

# 工程基本資料

工程名稱：新北市政府前廣場周遭人行環境改善工程

主辦機關：新北市政府養護工程處

設計監造：杜風工程服務股份有限公司

承攬廠商：辰茂營造工程有限公司

契約金額：38,330,000元

工期說明：開工：114年5月24日

完工：114年11月19日

工期：180日曆天

進度說明：預定進度15.90%

實際進度18.06%



本案範圍

# 工區目前施作狀況



# 分項施工進度表

工程名稱		新北市政府前廣場周遭人行環境改善工程		
契約金額		38,330,000元		
工程內容		溝蓋板更新工程：總長約610m 新設人行道工程：總長約610m、高壓磚2897m <sup>2</sup> 道路工程：AC刨鋪360m <sup>3</sup> 、標線538m <sup>2</sup> 分隔島工程：總長約85m		
施工分項		目前施作項目	預定下週施作項目	預定完成日期
溝蓋板更新 暨 新設人行道	新站路 AK+30-250	135/220	1. 第一階段人行道大底施作，高壓磚施作 2. 第二階段施作	114.08.14
	中山路 BK+000-220	0/180	無	114.09.30
	新府路 CK000-170	70/160	1. 第一階段人行道大底施作，高壓磚施作 2. 第二階段施作	114.08.25
分隔島工程	新站路 AK+165-250	30/85	1. 分隔島削減施作	114.07.20
道路工程	AC銑鋪及 標線劃設	0/360 0/538	無	114.10.15


# 工區照片



新站路第一階段路緣石施作



新站路第一階段溝蓋混凝土澆置

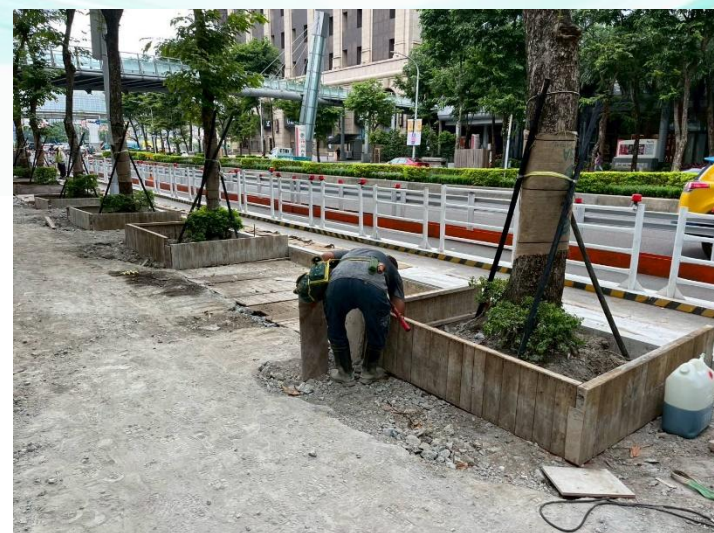


新站路第一階段樹穴封膜



新府路第一階段路緣石施作



新府路第一階段溝蓋混凝土澆置

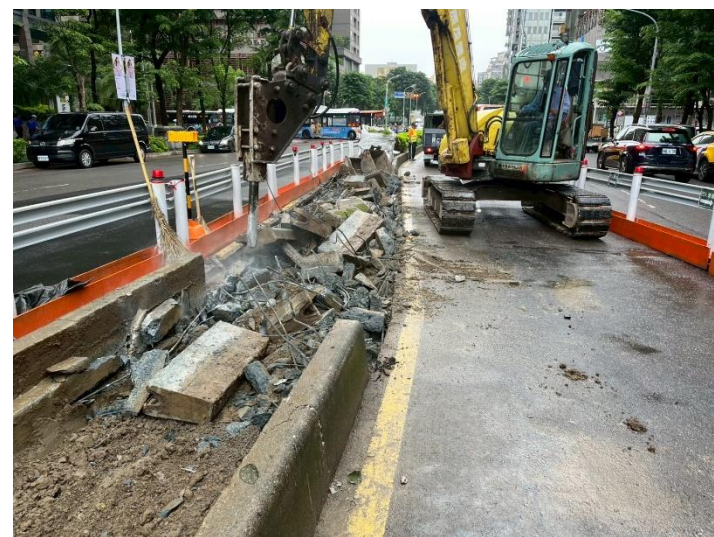

新站路分隔島打除
