



新北市政府 養護工程處

Maintenance Office, New Taipei City Government

新北市政府前廣場周遭人行環境 改善工程

施工動態說明

中華民國 114 年 10 月

工程基本資料

工程名稱：新北市政府前廣場周遭人行環境改善工程

主辦機關：新北市政府養護工程處

設計監造：杜風工程服務股份有限公司

承攬廠商：辰茂營造工程有限公司

契約金額：38,330,000元

工期說明：開工：114年5月24日


完工：114年11月19日

(提前完工114年10月31日)

工期：180(161)日曆天

進度說明：預定進度100%

實際進度100%

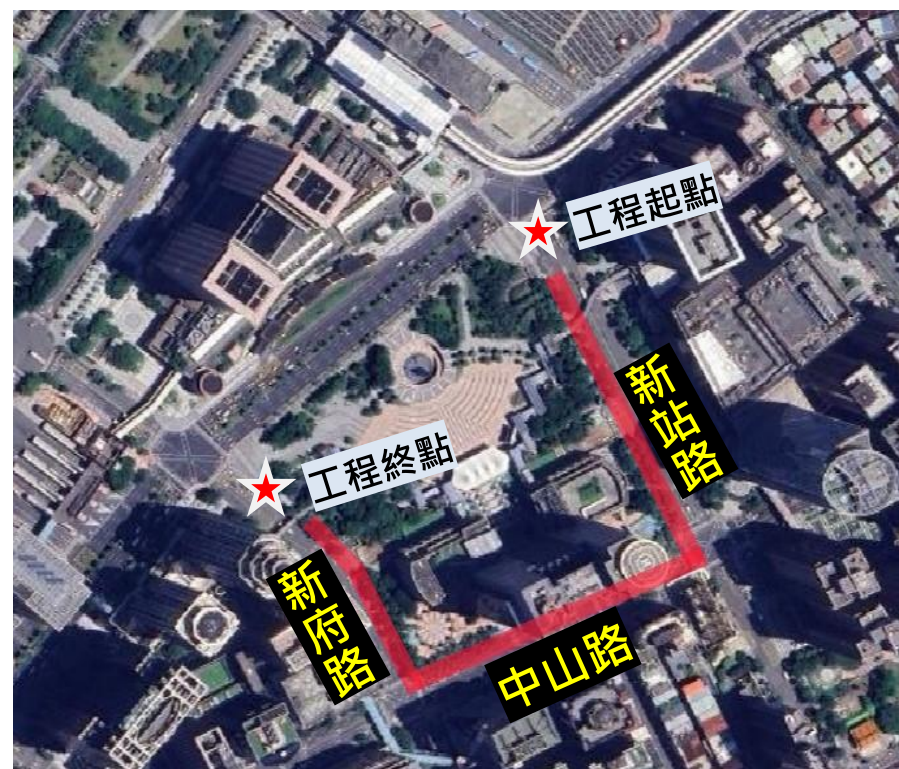

本案範圍

工區目前施作狀況




分項施工進度表

工程名稱		新北市政府前廣場周遭人行環境改善工程		
契約金額		38,330,000元		
工程內容		溝蓋板更新工程：總長約610m 新設人行道工程：總長約610m、高壓磚2897m ² 道路工程：AC刨鋪360m ³ 、標線538m ² 分隔島工程：總長約85m		
施工分項		目前施作項目	預定下週施作項目	預定完成日期
溝蓋板更新 暨 新設人行道	新站路 AK+30-250	220/220	已完成	114.08.14
	中山路 BK+000-220	180/180	已完成	114.09.30
	新府路 CK000-170	160/160	已完成	114.08.25
分隔島工程	新站路 AK+165-250	85/85	已完成	114.07.20
道路工程	AC銑鋪及 標線劃設	360/360 538/538	已完成	114.10.15

工區照片



新站路高壓磚完成

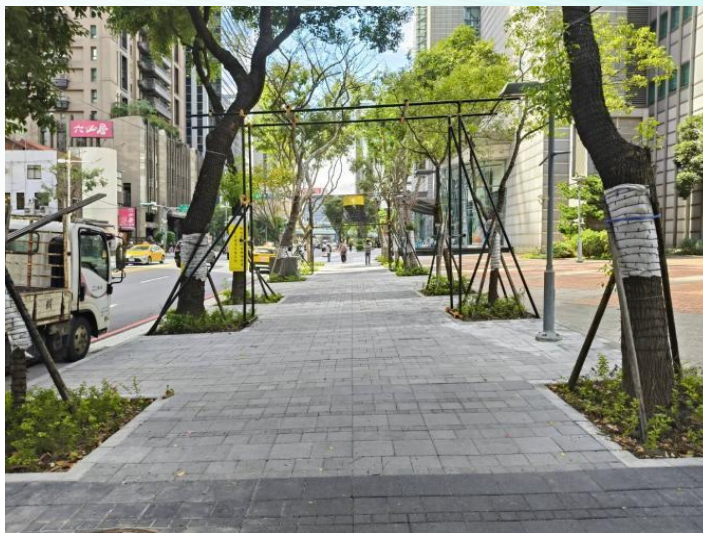

中山路高壓磚完成



新府路高壓磚完成



停車場出入口改善完成



Ubike設置完成



噴花地坪施作完成
