



新北市政府 養護工程處

Maintenance Office, New Taipei City Government

110年度提升道路品質計畫新北市人行環境改善工程(第12標)

新北市三鶯文創整合計畫

「館前路人本友善暨藝術廊道再造工程」

施工動態說明

中華民國111年4月3日

工程基本資料

(本案屬新北市工務局規劃鶯歌四藝徑-「藝」字路徑)

工程名稱：110年度提升道路品質計畫新北市人行環境改善工程(第12標)

-新北市三鶯文創整合計畫「館前路人本友善暨藝術廊道再造工程」

主辦機關：新北市政府養護工程處

設計監造：和建工程顧問股份有限公司

承攬廠商：逢國營造有限公司

契約金額：7,098萬元

工期說明：開工：111年2月11日

預計完工：111年8月9日

工期：180日曆天

進度說明：預定進度3.26%

實際進度9.41%

進度超前：+6.15%(截至111年3月31日)



現場施工照片 (第一工區-北側人行道0K+000-0K+390)



道路放樣切割



既有預鑄溝蓋打除



既有人行道打除



新設側溝開挖



側溝鋼筋綁紮與模板組立



側溝溝頂板施作

現場施工照片 (第二工區-南側人行道0K+000-0K+420)



弱電管溝埋設



交通措施維持



緣石擺放大底施作



植筋鑽孔作業




溝頂板鋼筋綁紮與模板



格柵蓋框預埋安裝


現場施工照片 (第三工區-南側人行道0K+420-0K+820)

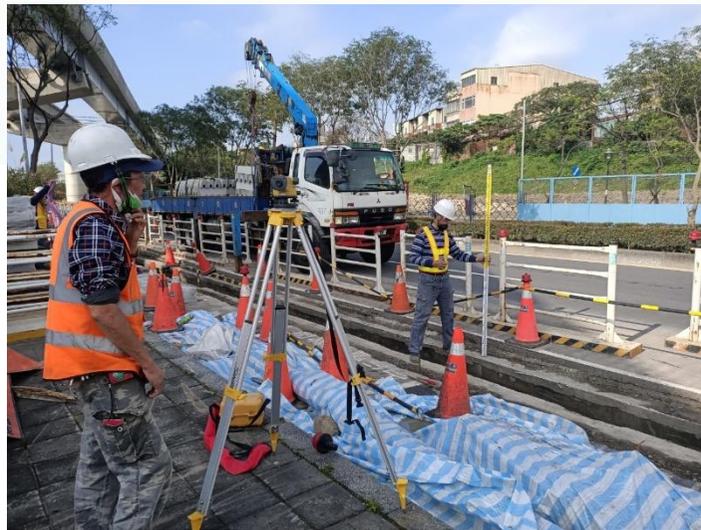

人行道高程放樣




緣石擺放

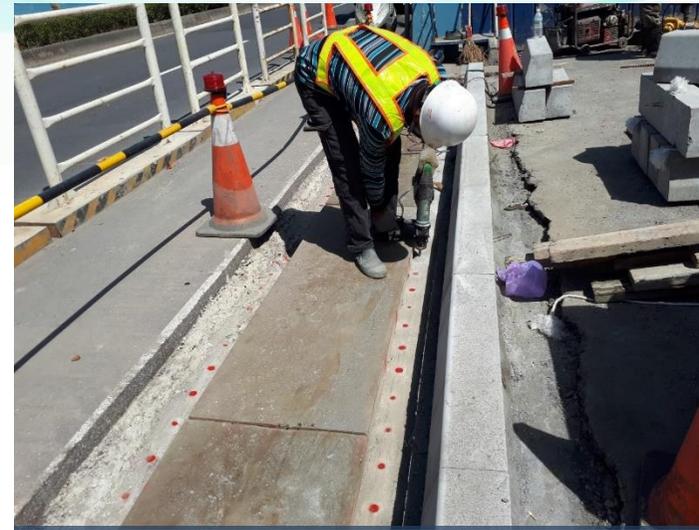

溝頂板植筋鑽孔



溝頂板混凝土澆置

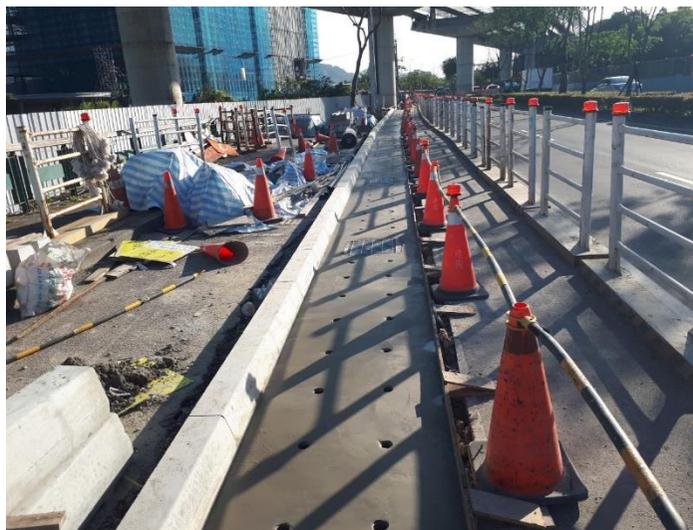

側溝溝頂板施作完成



混凝土濕潤養治
