



新北市政府 養護工程處

Maintenance Office, New Taipei City Government

110年度提升道路品質計畫新北市人行環境改善工程(第12標)

新北市三鶯文創整合計畫

「館前路人本友善暨藝術廊道再造工程」

施工動態說明

中華民國111年5月3日

工程基本資料

(本案屬新北市工務局規劃鶯歌四藝徑-「藝」字路徑)

工程名稱：110年度提升道路品質計畫新北市人行環境改善工程(第12標)

—新北市三鶯文創整合計畫「館前路人本友善暨藝術廊道再造工程」

主辦機關：新北市政府養護工程處

設計監造：和建工程顧問股份有限公司

承攬廠商：逢國營造有限公司

契約金額：7,098萬元

工期說明：開工：111年2月11日

預計完工：111年8月9日

工期：180日曆天

進度說明：預定進度14.76%

實際進度18.93%

進度超前：+4.17%(截至111年4月30日)



工區目前施作狀況



本案施工範圍：北側人行道(第一工區)、南側人行道(第二工區+第三工區)

他案施工範圍：捷工局(捷運站+空橋)、新工處(美術館+落客平台)
 交通局(三鶯轉運站+候車亭)、自來水(供水管更換)

現場施工照片 (第一工區-北側人行道0K+000-0K+390)




新設側溝開挖



新設側溝鋼筋綁紮

改善前

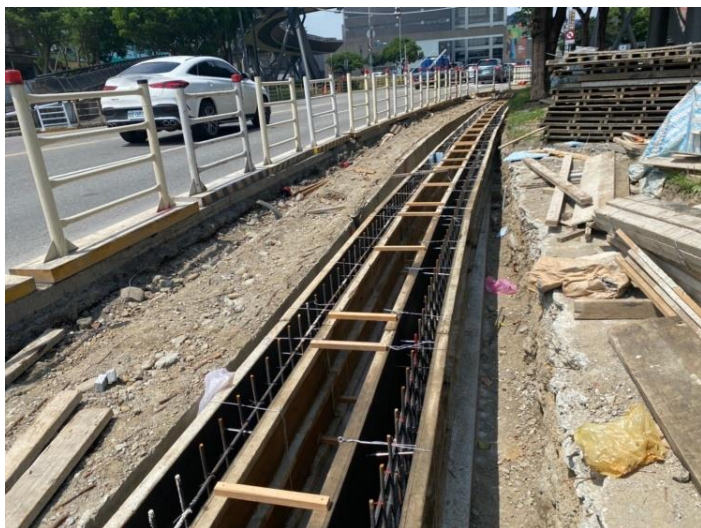

新設側溝模板組立



新設側溝混凝土澆置

改善後(模擬圖)



現場施工照片 (第二工區-南側人行道0K+000-0K+420)



人行道結構施作



人行道結構混凝土澆置




改善前



側溝溝蓋板施作




側溝溝蓋板混凝土澆置

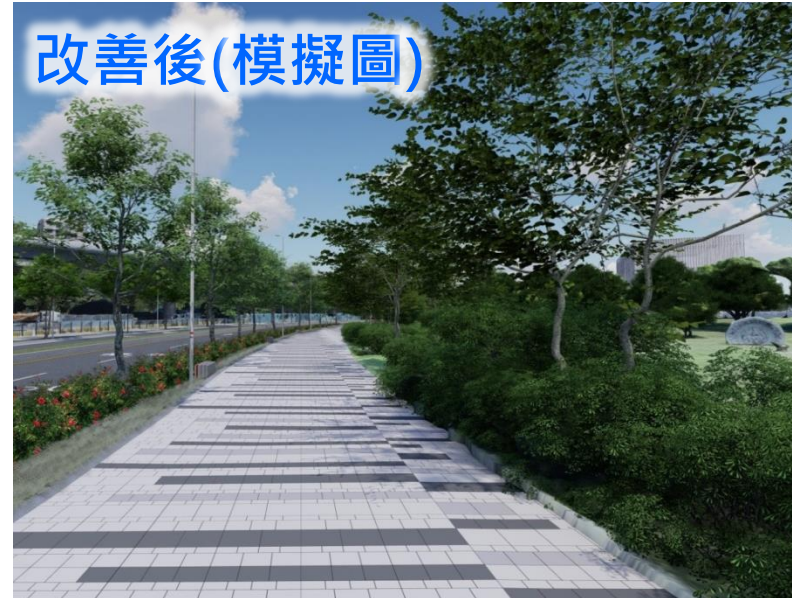

改善後(模擬圖)

現場施工照片 (第三工區-北側人行道0K+420-0K+820)

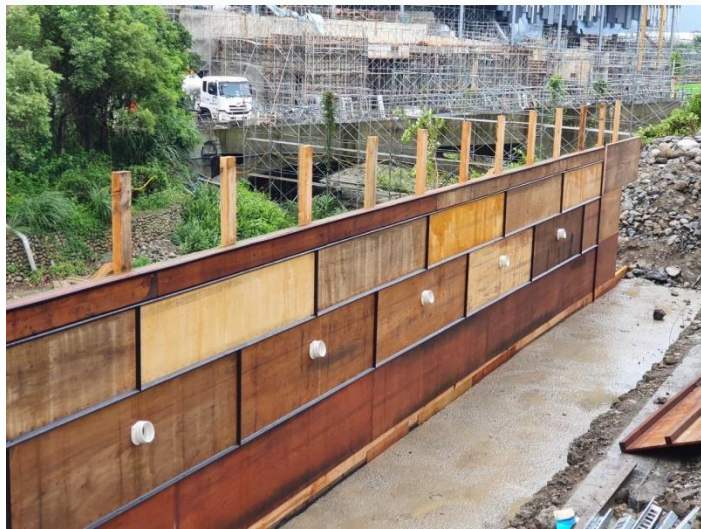

擋土牆外模組立



擋土牆鋼筋綁紮



改善前



擋土牆基礎澆置



擋土牆結構澆置



改善後(模擬圖)
