新北市政府 養護工程處
Maintenance Office, New Taipei City Government

新北市轄區內道路拓寬暨附屬設施人本環境改善工程(第2區)-新北科技園區(光復路一段至二段及興德路口)周邊人行道改善工程

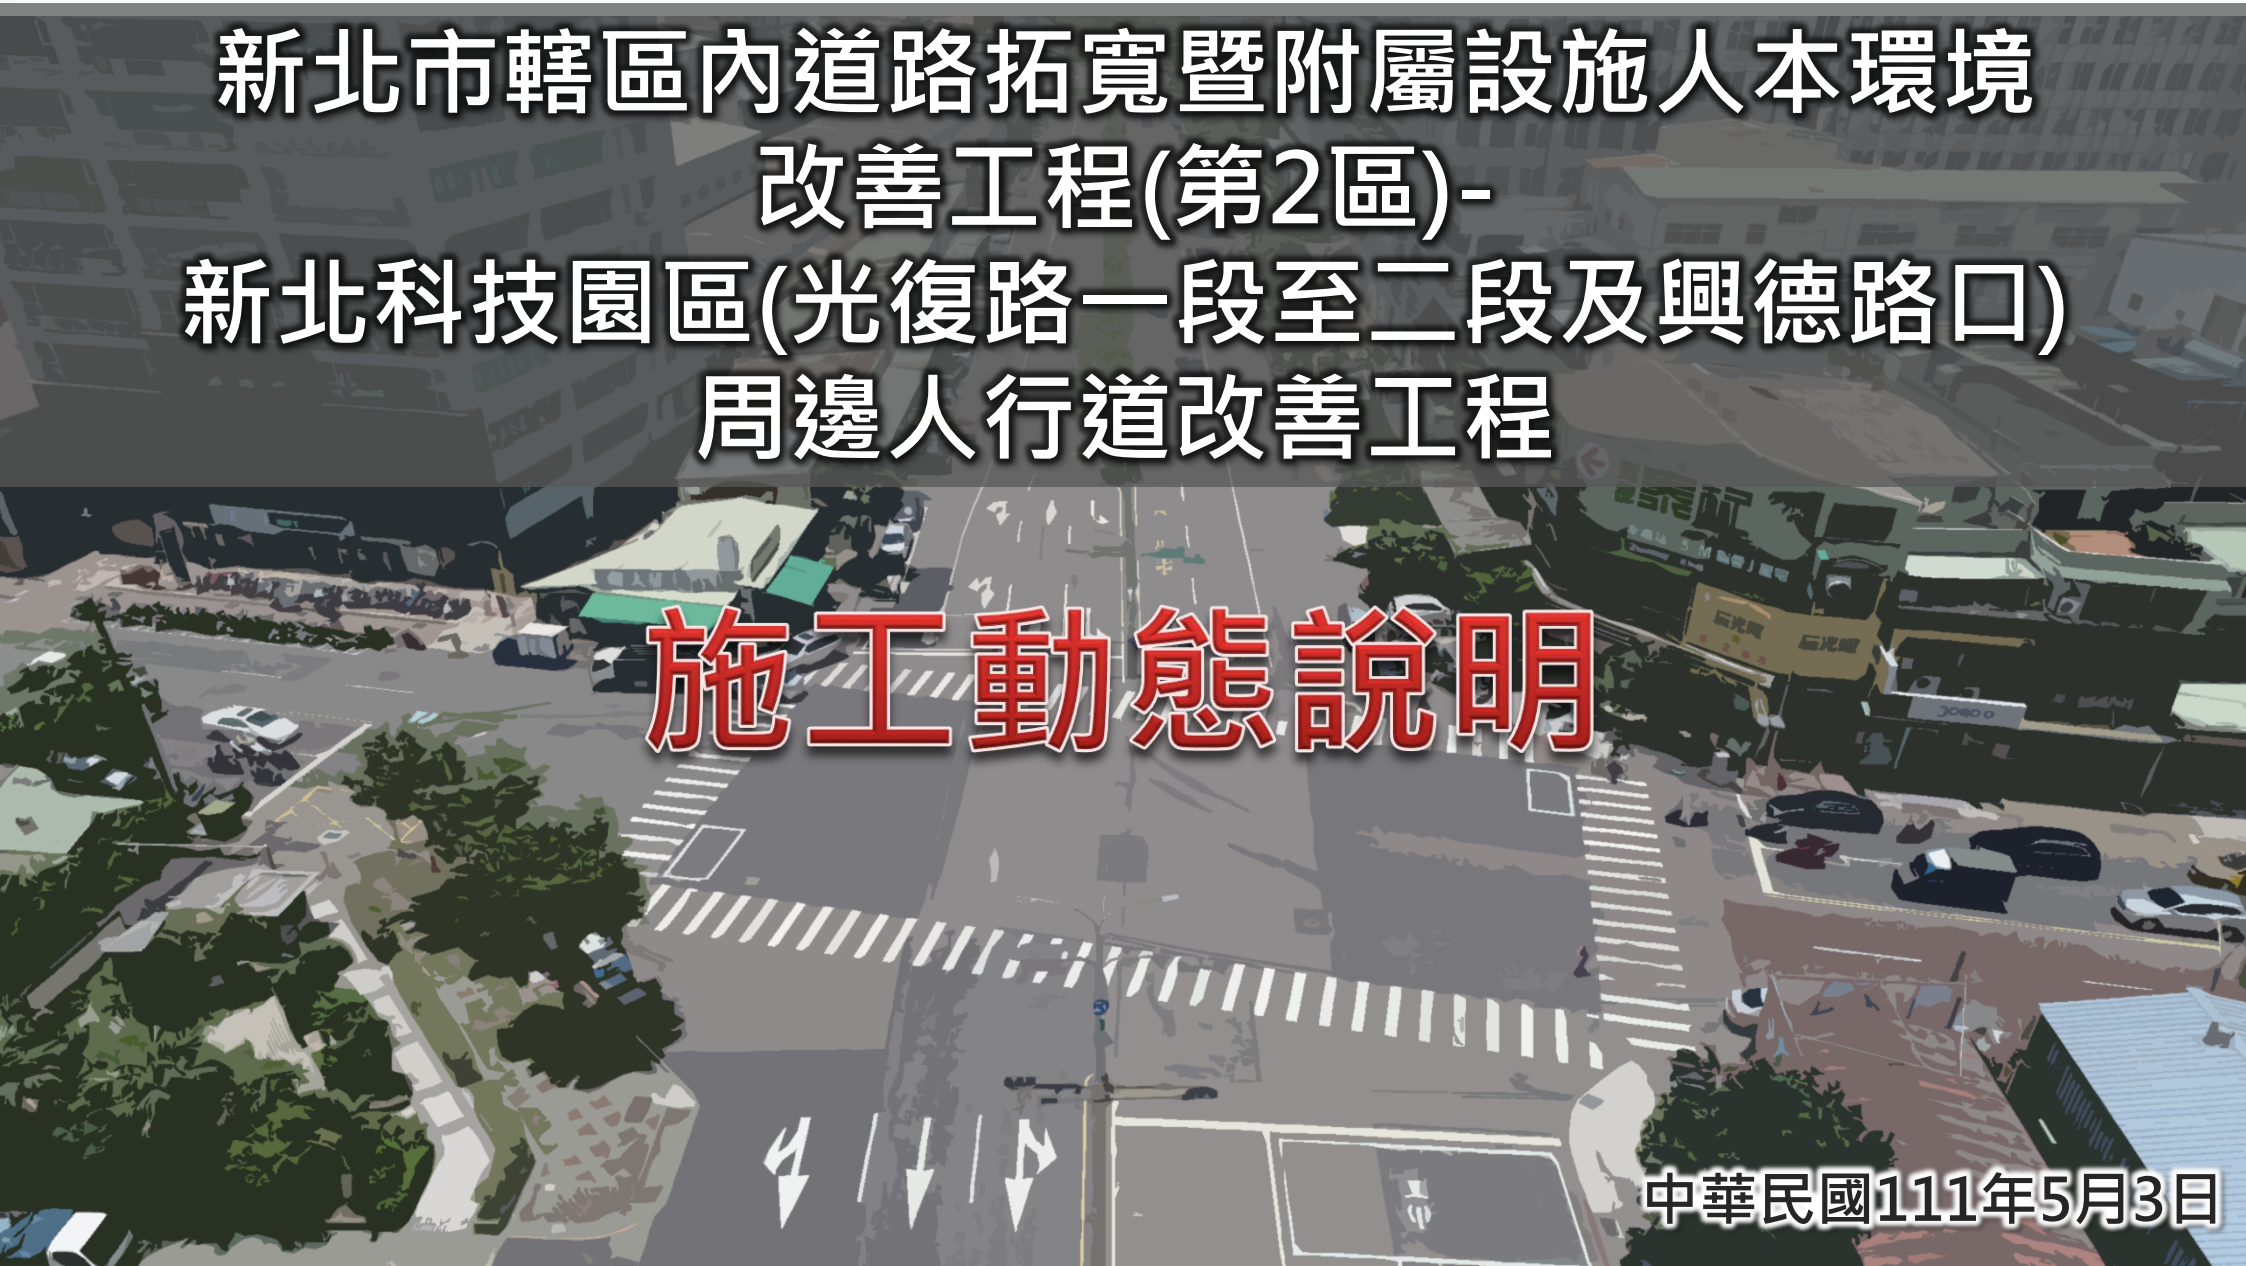

施工動態說明

中華民國111年5月3日

工程基本資料

工程名稱：境環本人施設屬附暨寬拓路道內區轄市北新改善工程(第2區)-
新北科技園區(光復路一段至二段及興德路口)周邊人行道改善工程

主辦機關：新北市政府養護工程處

設計監造：和建工程顧問股份有限公司

承攬廠商：北翰營造有限公司

契約金額：9,600萬元

工期說明：開工：110年10月31日

預計完工：111年10月5日

工期：340日曆天

進度說明：預定進度56.45%

實際進度56.58%

進度超前：+0.13%(截至111年4月30日)

工區範圍

工區目前施作狀況

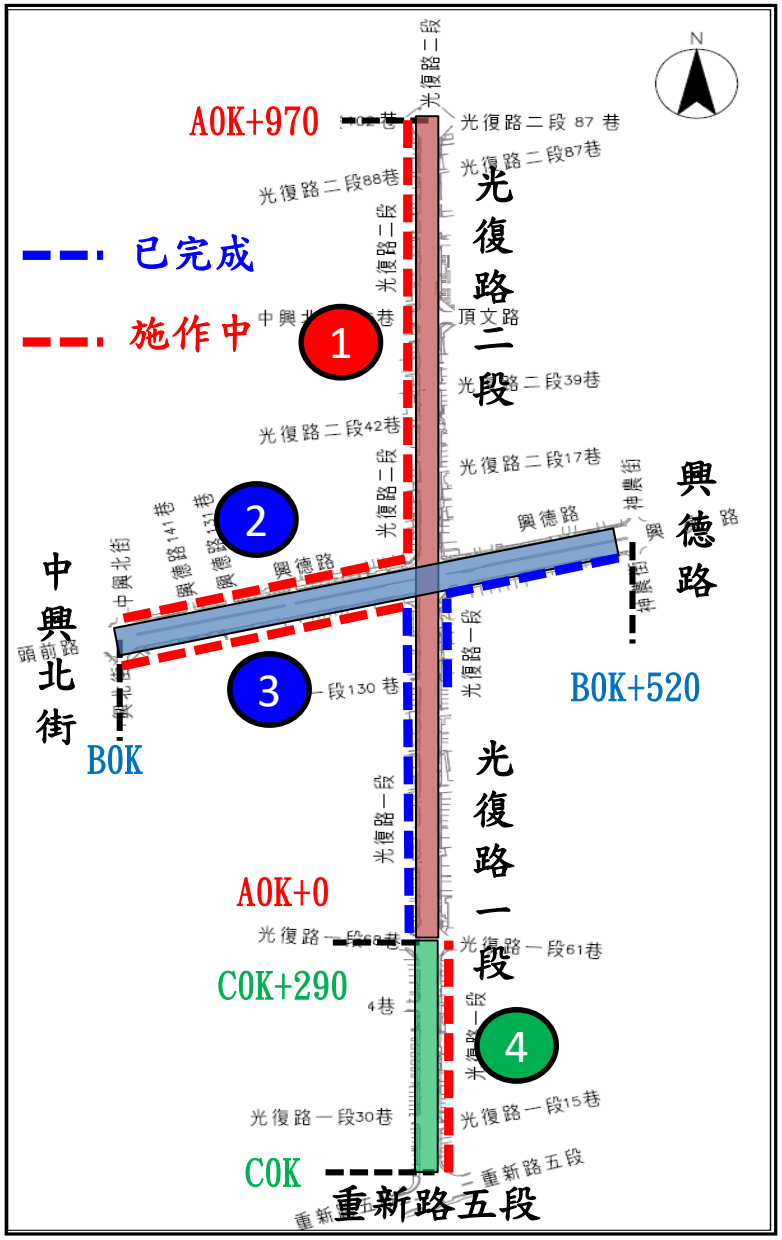

目前施作情形：

1.光復路二段左側(A0K+460~970)

--路緣石及人行道面層施作

2.興德路北側(B0K+0~320)

--人行道開挖

3.興德路南側(B0K+0~320)

--人行道及洩水板施作

4.光復路一段右側(C0K+0~290)

--人行道開挖

現場施工照片 (第一工區-光復路A0K+000~A0K+970)

人行道施作

高壓磚鋪設

改善前

臨時AC施作

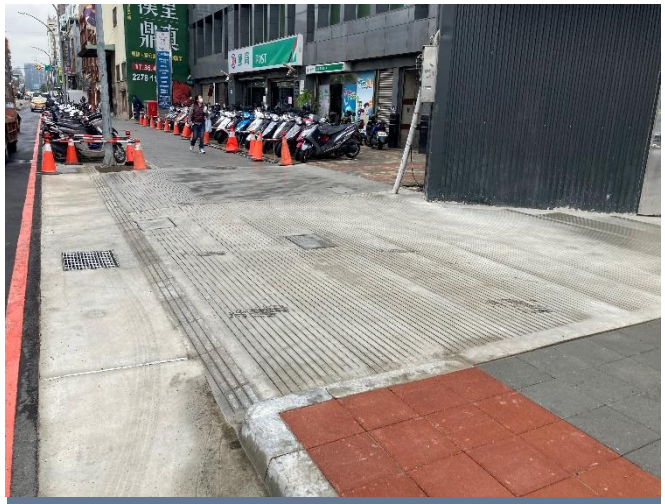

車行斜坡施作

改善後(模擬圖)

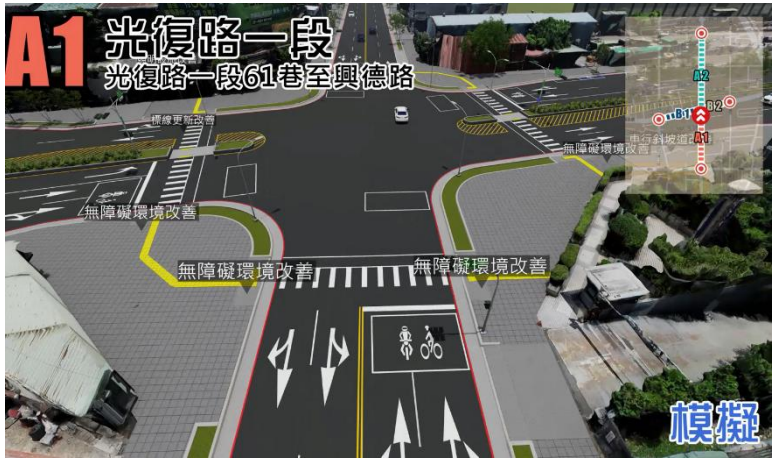

現場施工照片 (第二工區-興德路B0K+000~B0K+520)

大廣場(遠見大樓前)

雙排機車彎(遠見大樓前)

改善前

路緣石及收水井施作

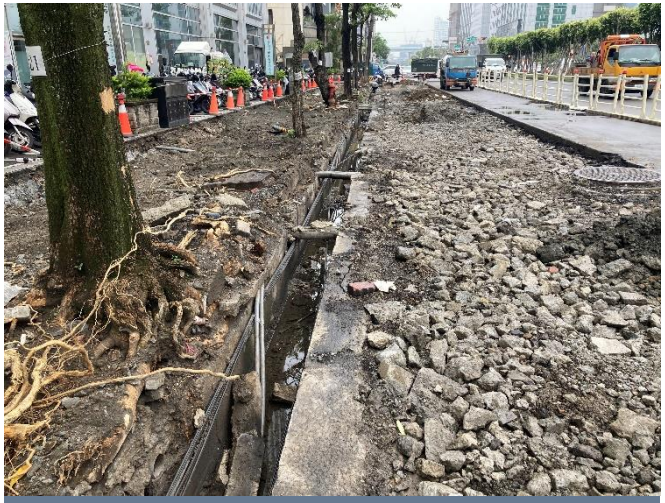

人行道開挖

改善後(模擬圖)

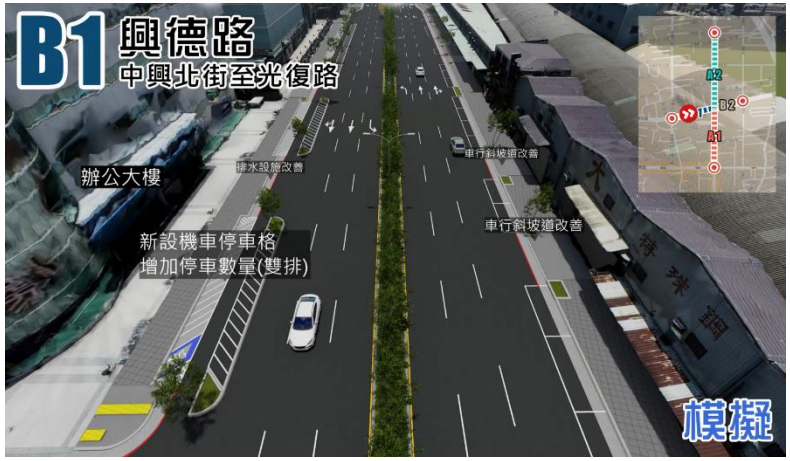

現場施工照片 (第三工區-光復路C0K+000~C0K+290)

人行道開挖

人行道開挖
